POLYUPROTEC S.A. · SISTEMA DE MONITOREO OPERATIVO

Torre de Control v3.2 — Antecedentes, funcionamiento y manual de uso

12/11/2026 · Jeider Buelvas — Desarrollo Full Stack

Presentación

Este documento reúne los antecedentes, el funcionamiento y el manual de uso de la Torre de Control v3.2 de Polyuprotec S.A., como insumo para elaborar los procedimientos internos y el manual de instrucciones. La entrega solicitada vence el 30/11/2026.

Dato	Valor
Sistema	Torre de Control · Sistema de Monitoreo Operativo
Versión del sistema	v3.2 (12/11/2026)
Componentes	Maestra v4.7 · Macro Comercial v14.10 · Producción V2 v4.5 (archivos Bogotá y Barranquilla) · App web 11/11/2026
Responsable técnico	Jeider Buelvas, Desarrollador Full Stack
Destinatarios	Responsables de procesos, calidad y documentación interna
Acceso a la App	https://torredecontrol.polypro.space/torre_de_control_v2/ (cuentas @polyuprotec.com)

Cómo usar este documento

- Secciones 1 a 4: contexto, arquitectura, roles y ciclo de vida de una OP. Base para el alcance y las definiciones de los procedimientos.
- Secciones 5 a 7: manual de usuario por actor (Comercial, áreas, Producción, App).
- Secciones 8 y 9: reglas de cálculo, protección de datos y notificaciones. Base para los criterios de control.
- Secciones 10 y 11: administración técnica y solución de problemas.
- Sección 12: procedimientos propuestos, listos para adaptar al formato del sistema de gestión.

Las contraseñas, tokens y claves técnicas no se incluyen en este documento. Los custodia el responsable técnico.

1. Antecedentes del proyecto

La Torre de Control nace para ver en un solo lugar el estado real de cada Orden de Producción (OP), desde que Comercial la registra hasta que se entrega al cliente. Antes, cada área llevaba su cronograma por separado y no había una vista consolidada ni trazabilidad de los cambios.

1.1 Problema que resuelve

- Cada área (Diseño, Dibujo, Compras, Producción, Galvanizado, Pintura, Logística, Montaje, Administración) registraba su avance en archivos propios, sin una vista única por OP.
- No había forma confiable de saber si una OP iba a tiempo frente a la fecha comprometida con el cliente.
- Las fechas podían modificarse sin dejar registro de quién, cuándo ni por qué.
- Algunos indicadores mostraban cumplimiento falso: 100% o "al día" sin avance registrado.

1.2 Objetivos

1. Consolidar el avance de todas las áreas por OP, subestructura y tarea.
2. Medir el cumplimiento de cada proceso contra su plan y el cumplimiento de entrega al cliente.
3. Mostrar riesgos, retrasos y falta de planeación, sin ocultarlos.
4. Proteger las fechas reales y la fecha comprometida, con trazabilidad de cada cambio.
5. Avisar automáticamente por correo los eventos importantes.

1.3 Alcance

- **Incluye:** registro y edición de OP (Comercial), cronogramas por área, registro diario de Producción, consolidación en la Maestra, App web de consulta, Tareas de la O.P. (compromisos de reunión por OP), historial de cambios y notificaciones. Desde v3.2, Producción trabaja con un archivo por planta (Bogotá y Barranquilla) y la App filtra por planta.
- **No incluye (por ahora):** integración de la base de Compras y migración de los registros de Producción de octubre; quedaron fuera por decisión del 03/11/2026.
- **Excluido expresamente:** botones de "liberación rápida" para que Comercial libere Dibujo u otras áreas. La propuesta se descartó en la reunión.

1.4 Cronología de versiones

Fecha	Versión	Cambio principal
12/11/2026	v3.2	App: indicador 🟢 **en línea** (quién está viendo la Torre, en qué vista y planta, y quién entró hoy) y enlace 📘 **Manual de usuario** en el menú
11/11/2026	v3.2	"Bitácora" pasa a llamarse 📝 **Tareas de la O.P.** en la App, el Historial y el correo semanal; el envío a las áreas ya no falla si un área deja un filtro activo (Comercial v14.10)
09/11/2026	v3.2	Cronogramas sin #DIV/0! ni 01/01/1900; los días de las tareas No aplica ya no suman en TOTAL_DIAS; Editar OP carga la OP aunque el comercial guardado ya no esté en la lista (Comercial v14.9)
06/11/2026	v3.2	Producción en dos plantas: un archivo para Bogotá y otro para Barranquilla, filtro Planta e insignias BOG/BAQ/MIXTO en la App y columna PLANTA en el Historial (Producción V2 v4.5, Comercial v14.8, Maestra v4.6)
06/11/2026	v3.2	Producción con 2 tareas por subestructura: Kg Fabricados (50%) y Entrega en negro (50%), y fila diaria ENTREGA MATERIAL EN NEGRO (Producción V2 v4.4, Comercial v14.7)
05/11/2026	v3.1	Buscar O.P, mejoras de velocidad en edición, texto "Se registró una nueva O.P" en el correo
04/11/2026	v3.1	Bitácora de la OP con correo semanal
03/11/2026	v3.0	Acuerdos de la reunión: protección de fechas, historial, semáforo por plan, avance y entrega, "Sin planeación", cumplimiento de entrega al cliente, tareas "No aplica"
30/10/2026	v2.x	Gantt: validación de fechas, avisos ⚠, formato dd/mm/aaaa, paginador, botón de observaciones
Finales de octubre de 2026	v2.x	Fecha de entrega en todas las áreas, edición de OP con registro, Producción V2 con registro diario, vista Producción diaria, correo de nueva OP
Octubre de 2026	v1.x	Torre original: plantillas por área, Maestra consolidada, App web y macro de Comercial

1.5 Acuerdos de la reunión del 03/11/2026 incorporados

- Toda tarea nueva inicia en estado "Abierto"; no se asume avance sin registro.
- La fecha fin real de una tarea terminada y la fecha de entrega comercial son línea base: no se modifican sin autorización y todo intento queda registrado.
- Historial de cambios de solo consulta, con usuario, fecha, valor anterior y nuevo.
- Notificación automática de cambios críticos.
- Una OP sin fechas planeadas se muestra como "⚠ Sin planeación", no como "al día".
- El cumplimiento solo se calcula con evidencia real (tareas terminadas o kg registrados).
- Secuencia de áreas parametrizable: Diseño → Dibujo → Compras → Producción → Galvanizado → Pintura → Logística → Montaje → Administración.
- Vista general con OP activas, avance consolidado, en riesgo, retrasadas y sin planeación.
- Indicador organizacional de cumplimiento de entrega al cliente (solicitud posterior a la reunión).

2. Arquitectura y componentes

La Torre funciona con archivos de Google Sheets que tienen macros (Apps Script) y una App web alojada en el hosting de la empresa. La información nace en Comercial, se registra en los cronogramas de cada área, se consolida en la Maestra y se consulta en la App.

2.1 Inventario de componentes

Componente	Dónde vive	Versión	Qué hace
PLANTILLA_LOOKER_COMERCIAL	Google Sheets + Apps Script	v14.10	Registra y edita OP, las envía a las áreas (Producción según la planta), marca tareas "No aplica", registra entregas reales y reprogramaciones, busca OP
Cronogramas de área (9 archivos)	Google Sheets, hoja "Cronograma"	Plantilla por área	Cada área registra estado, fechas reales, kg avanzados y observaciones de sus tareas
PLANTILLA_LOOKER_PRODUCCION_V2 (Barranquilla) y PLANTILLA_LOOKER_PRODUCCION_V2_BOGOTA	Google Sheets + Apps Script	v4.5	Un archivo por planta: cronograma de Producción y hojas mensuales con kg fabricados y kg entregados en negro por día; sincroniza las dos tareas al cronograma
TORRE_CONTROL_MAESTRA_POLYUPROTEC	Google Sheets + Apps Script + Web App	v4.7	Importa todas las áreas (Producción de las dos plantas), consolida en LOOKER_MAESTRA, calcula indicadores, vigila cambios, guarda el historial y las Tareas de la O.P., entrega los datos a la App
App web	Hosting torredecontrol.polypro.space	12/11/2026	Tablero de consulta con inicio de sesión Google (@polyuprotec.com), filtro por planta, Tareas de la O.P., indicador 🟢 en línea, enlace al manual y análisis con IA
Correos automáticos	Hosting (archivos PHP)	03–11/11/2026	Nueva OP, cambios críticos cada 15 min y resumen semanal de las Tareas de la O.P., desde notificacion@torredecontrol.polypro.space

2.2 Hojas principales de la Maestra

Hoja	Contenido	Quién la escribe
DISEÑO, DIBUJO, COMPRAS, …	Copia del cronograma de cada área (IMPORTRANGE A5:AK)	Fórmula de importación
PRODUCCION y PRODUCCION_BOGOTA	Cronograma de Producción de Barranquilla y de Bogotá	Fórmula de importación (menú 🏭 Conectar Producción Bogotá)
LOOKER_MAESTRA	Todas las áreas en una sola tabla de 40 columnas	Menú 🔄 Actualizar LOOKER_MAESTRA
CURVA_S	Avance planeado vs real acumulado	Menú 📈 Generar Curva S
PRODUCCION_DIARIA	Kg reales y planeados por día, OP y subestructura	Menú 🏭 Actualizar Producción diaria
HISTORIAL_CAMBIOS	Registro de cambios e intentos bloqueados, con columna PLANTA (solo consulta)	Script de vigilancia
LINEA_BASE	Fechas protegidas por tarea (oculta)	Script de vigilancia
BITACORA_OP	Tareas de la O.P.: notas, compromisos y bloqueos de cada OP (la hoja conserva su nombre interno)	Script, desde la App

2.3 Hojas de control en Comercial

Hoja	Contenido
BASE_CREADOR	Formulario para registrar o editar una OP
Una hoja por OP (4127, 4115, …)	Plan de la OP por área, subestructura y tarea; metadatos en AB1:AM1
REGISTRO_CAMBIOS	Cada creación, edición y envío de OP
ENTREGAS_CLIENTE	Fecha original, vigente, reprogramaciones y entrega real por OP
REPROGRAMACIONES_ENTREGA	Cada cambio de fecha de entrega con su motivo

Las hojas de control pueden ocultarse; no deben renombrarse, borrarse ni editarse a mano.

3. Roles y responsabilidades

Comercial es el único rol que crea, edita y cierra la línea base comercial de una OP; cada área es dueña solo de su avance real.

Rol	Responsabilidades en la Torre	No le corresponde
Comercial	Registrar la OP con fecha de entrega, completar plan, kg y subestructuras en la hoja de la OP, enviarla a las áreas, reprogramar con motivo, marcar tareas "No aplica", registrar la entrega real	Registrar avance de las áreas
Jefe o responsable de área	Registrar estado, inicio y duración reales, kg avanzados y observaciones de sus tareas; cerrar los compromisos de las Tareas de la O.P. que le asignen	Cambiar la fecha de entrega, marcar "No aplica", modificar fechas de tareas ya terminadas
Producción (Bogotá y Barranquilla)	Registrar cada día, en el archivo de su planta, los kg fabricados y los kg entregados en negro, y sincronizarlos al cronograma	Registrar kg de OP de la otra planta; editar a mano el estado de "Kg Fabricados" o "Entrega en negro" cuando lo calcula la sincronización
Gerencia y coordinación	Revisar la vista ejecutiva, el semáforo, el cumplimiento de entrega y las alertas; dar seguimiento a las Tareas de la O.P.	—
Usuario autorizado de fechas	Corregir una fecha protegida cuando hay una razón justificada; el cambio queda registrado	Corregir sin dejar el motivo
Administrador técnico	Instalar y publicar versiones, mantener IDs, permisos, tokens y activadores, revisar el historial y los correos	Registrar datos operativos
Cualquier usuario con sesión en la App	Consultar todas las vistas y anotar en las Tareas de la O.P. de cualquier OP	Modificar datos de cronogramas desde la App

Las listas de usuarios autorizados están en el código: AUTORIZADOS_FECHAS en la Maestra y AUTORIZADOS_ENTREGA en Comercial. Hoy están vacías; la empresa debe definir quiénes van.

4. Ciclo de vida de una OP

Una OP recorre nueve pasos: se registra en Comercial, se planea, se envía a las áreas, cada área registra su avance, la Torre la vigila y Comercial registra la entrega real al cliente.

1. **Registro (Comercial).** En BASE_CREADOR se diligencian número de OP, proyecto, cliente, comercial, sede, número de subestructuras, fecha de entrega al cliente y áreas. La **sede** define la planta de Producción: BOGOTÁ, BARRANQUILLA o MIXTO (parte en cada planta). El botón "Crear Nueva OP" crea la hoja de la OP. Esa fecha queda como **fecha comprometida original** y sale el correo "Se registró una nueva O.P".
2. **Planeación (Comercial).** En la hoja de la OP se completan el nombre y los kg de cada subestructura, y la fecha de inicio y la duración planeadas de cada tarea. Si una tarea no se hace en ese contrato, se marca "No aplica" en 🧩 Ajustar tareas del cronograma.
3. **Envío a áreas (Comercial).** "📤 Enviar / Actualizar OP en Áreas" crea o actualiza la OP en el cronograma de cada área, sin borrar lo que el área ya registró. Producción la recibe en el archivo de su planta; una OP MIXTO va a los dos.
4. **Ejecución (áreas).** Cada área cambia el estado de sus tareas (Abierto, En pausa, Reproceso, Terminado) y registra inicio y duración reales, kg avanzados y observaciones. Producción registra cada día los kg fabricados y los entregados en negro en el archivo de su planta.
5. **Consolidación (Maestra).** La Maestra importa todos los cronogramas, arma LOOKER_MAESTRA y calcula avance, semáforo y cumplimiento. La App lee esos datos.
6. **Vigilancia (automática).** Cada edición de fechas, estados o kg queda en el Historial. Si alguien intenta cambiar una fecha protegida, el cambio se revierte y se notifica.
7. **Seguimiento (todos).** En la App se revisan semáforo, Gantt, alertas y las Tareas de la O.P. Los compromisos de cada reunión y los bloqueos se anotan en 📝 Tareas de la O.P.
8. **Reprogramación (Comercial, si aplica).** Si el cliente o la empresa mueven la entrega, Comercial edita la OP; la macro pide un motivo obligatorio y guarda la reprogramación. La fecha original no cambia.
9. **Entrega y cierre (Comercial).** "🚚 Registrar entrega real al cliente" guarda la fecha real; desde ese momento la fecha comprometida ya no se puede reprogramar. La entrega cuenta para el indicador de cumplimiento del mes.

5. Manual de usuario — Comercial

Todo el trabajo de Comercial se hace en PLANTILLA_LOOKER_COMERCIAL, con el formulario BASE_CREADOR, los botones de la hoja y los menús "🚀 Torre de Control" y "🔎 Buscar O.P".

5.1 Menús disponibles

Menú	Opción	Para qué sirve
🚀 Torre de Control	➕ Crear Nueva OP / 💾 Guardar cambios	Crea la OP; en modo edición guarda los cambios
🚀 Torre de Control	✏️ Cargar OP para editar	Lleva una OP existente al formulario
🚀 Torre de Control	✖️ Cancelar edición	Sale del modo edición sin guardar
🚀 Torre de Control	📤 Enviar / Actualizar OP en Áreas	Crea o actualiza la OP en los cronogramas de las áreas
🚀 Torre de Control	🧩 Ajustar tareas del cronograma (No aplica / nombre)	Marca tareas "No aplica" o les pone un nombre propio en esa OP. Antes se llamaba "Tareas de la OP"; no confundir con 📝 Tareas de la O.P. de la App
🚀 Torre de Control	🚚 Registrar entrega real al cliente	Guarda la fecha en que se entregó la OP
🚀 Torre de Control	🔄 Extraer Datos al Gantt	Llena la hoja "Cronograma Comercial" con las tareas de la OP de B4
🚀 Torre de Control	📋 Ver registro de cambios	Abre REGISTRO_CAMBIOS
🚀 Torre de Control	📨 Reenviar correo de una O.P	Vuelve a enviar el aviso de nueva OP
🚀 Torre de Control	Opciones de una sola vez	Agregar campo Fecha de entrega, Autorizar acceso a áreas, Probar correo, Ordenar lista de áreas, Preparar registro de entregas
🚀 Torre de Control	🔁 Migrar Producción a Kg Fabricados + Entrega en negro (una vez)	Pasa las OP no terminadas de las 5 tareas antiguas a las 2 nuevas, en los dos archivos de Producción. Se puede repetir sin riesgo
🚀 Torre de Control	🩹 Corregir fórmulas: #DIV/0!, 01/01/1900 y días No aplica	Corrige esas fórmulas en las hojas de OP y en los cronogramas de todas las áreas. Se puede repetir sin riesgo
🔎 Buscar O.P	🔎 Buscar O.P...	Abre el buscador de OP
🔎 Buscar O.P	🏠 Ir a BASE_CREADOR	Vuelve al formulario

5.2 Registrar una OP nueva

1. Ir a BASE_CREADOR y llenar los campos obligatorios: número de OP (C3), nombre del proyecto, cliente, comercial responsable, sede, subestructuras y fecha de entrega al cliente.
2. Marcar las áreas que participan.
3. Pulsar **Crear Nueva OP** y confirmar el resumen.

4. En la hoja nueva de la OP, completar nombre y kg de cada subestructura (columnas E y F) y la fecha de inicio y la duración planeadas de cada tarea (columnas I y J).
5. Si alguna tarea no aplica al contrato, usar 🧩 Ajustar tareas del cronograma (5.6).
6. Pulsar 📤 **Enviar / Actualizar OP en Áreas** y confirmar.

Si el número ya existe, la macro ofrece cargarla para editarla en lugar de duplicarla.

Sede y planta de Producción. La sede elegida (C7) decide a qué archivo de Producción va la OP:

Sede	Archivo de Producción
BOGOTÁ	Producción Bogotá
BARRANQUILLA	Producción Barranquilla
BOG Y BAQ (MIXTO)	Los dos. En la hoja de la OP, en la sección PRODUCCION, se escribe en la columna G (Sede) la planta de cada subestructura; cada planta ve solo las suyas

Si después se cambia la sede, al enviar la OP la macro la quita del archivo de la planta que ya no le corresponde, con confirmación.

5.3 Editar una OP

1. Usar ✏️ Cargar OP para editar, o el botón ✏️ Editar dentro de 🔎 Buscar O.P.
2. Corregir lo necesario en el formulario. El número de OP no se puede cambiar.
3. Pulsar el botón principal (en modo edición dice Guardar cambios) y revisar el resumen de cambios.
4. Si cambió la fecha de entrega, escribir el **motivo obligatorio** (5.5).
5. Aceptar la actualización en las áreas, o hacerla después con 📤 Enviar / Actualizar.

Las fechas, los kg y las observaciones que ya tenía la hoja se conservan, incluso si se agregan o quitan áreas o subestructuras. Si se quitan subestructuras con avance, la macro avisa antes de borrarlas.

Si la OP tiene guardado un comercial que ya no está en la lista de C6 (por ejemplo, porque se corrigió la ortografía del nombre), la OP se carga completa igual, C6 queda vacío y sale un aviso para escoger el comercial correcto antes de guardar.

5.4 Buscar una OP

1. Abrir 🔎 Buscar O.P o pulsar el botón de la hoja.
2. Escribir parte del número, proyecto, cliente, comercial o sede. No importan tildes ni mayúsculas.
3. Hacer clic en la OP (o moverse con ↑ ↓ y pulsar Enter). Aparece la barra "Abriendo O.P..." hasta que Google abre la hoja.
4. ✏️ Editar carga la OP en el formulario; ↻ actualiza la lista.

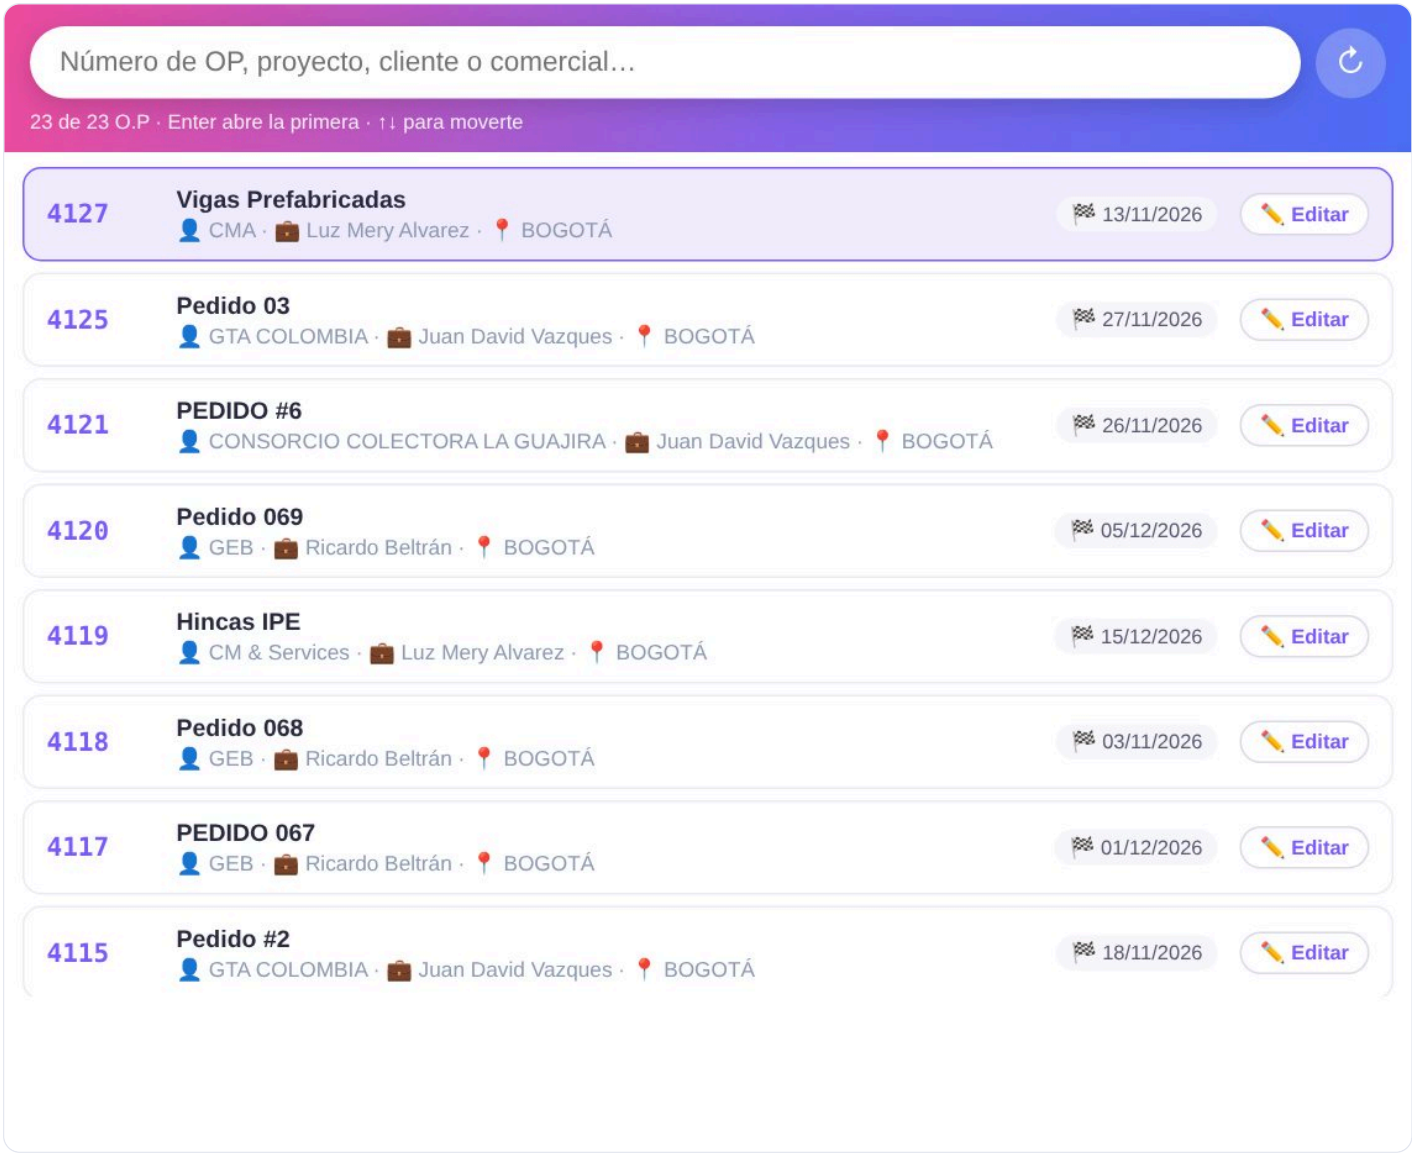


Figura 1. Cuadro 🔎 Buscar O.P en el archivo Comercial: escriba número, proyecto, cliente o comercial; Enter abre la primera coincidencia y ✏️ Editar la carga para edición.

5.5 Reprogramar la fecha de entrega

1. Cargar la OP para editar y cambiar la fecha de entrega.
2. Al guardar, elegir el motivo: 1 Solicitud del cliente, 2 Causa interna, 3 Materiales o proveedores, 4 Cambio de alcance, 5 Otro.
3. Escribir el comentario; con "Otro" es obligatorio.

La reprogramación queda en REPROGRAMACIONES_ENTREGA y en REGISTRO_CAMBIOS. La fecha original no cambia y sigue siendo la referencia del indicador oficial. Si la OP ya tiene entrega real, no se puede reprogramar.

5.6 Tareas que no aplican y nombre de tarea por OP (🧩 Ajustar tareas del cronograma)

1. Abrir la hoja de la OP y usar 🧩 Ajustar tareas del cronograma (No aplica / nombre).
2. Marcar ☐ No aplica en las tareas que no se hacen en ese contrato. Su peso se reparte entre las demás tareas de la subestructura.
3. Si hace falta, escribir un "Nombre en esta OP". Solo cambia lo que ve el área; por dentro se conserva el nombre original.
4. Guardar y pulsar 📤 Enviar a las áreas.

Cada subestructura debe tener al menos una tarea que aplique. "Kg Fabricados" y "Entrega en negro" de Producción no se pueden renombrar, porque Producción V2 las usa para sincronizar los kg. No se deben borrar filas de tareas a mano.

Desde v3.2, los días planeados y reales de las tareas No aplica **no suman** en TOTAL_DIAS (en la hoja de la OP y en el cronograma del área) y esas tareas quedan con 0 % de participación. Sin tareas No aplica, todo funciona igual que antes.

☐ **No aplica**: la tarea no se hace en este contrato. Su peso se reparte entre las demás tareas de la subestructura y en el área queda en estado "No aplica".
✏️ **Nombre en esta OP**: cambia solo el texto que ven las áreas en esta OP (vacío = nombre original).

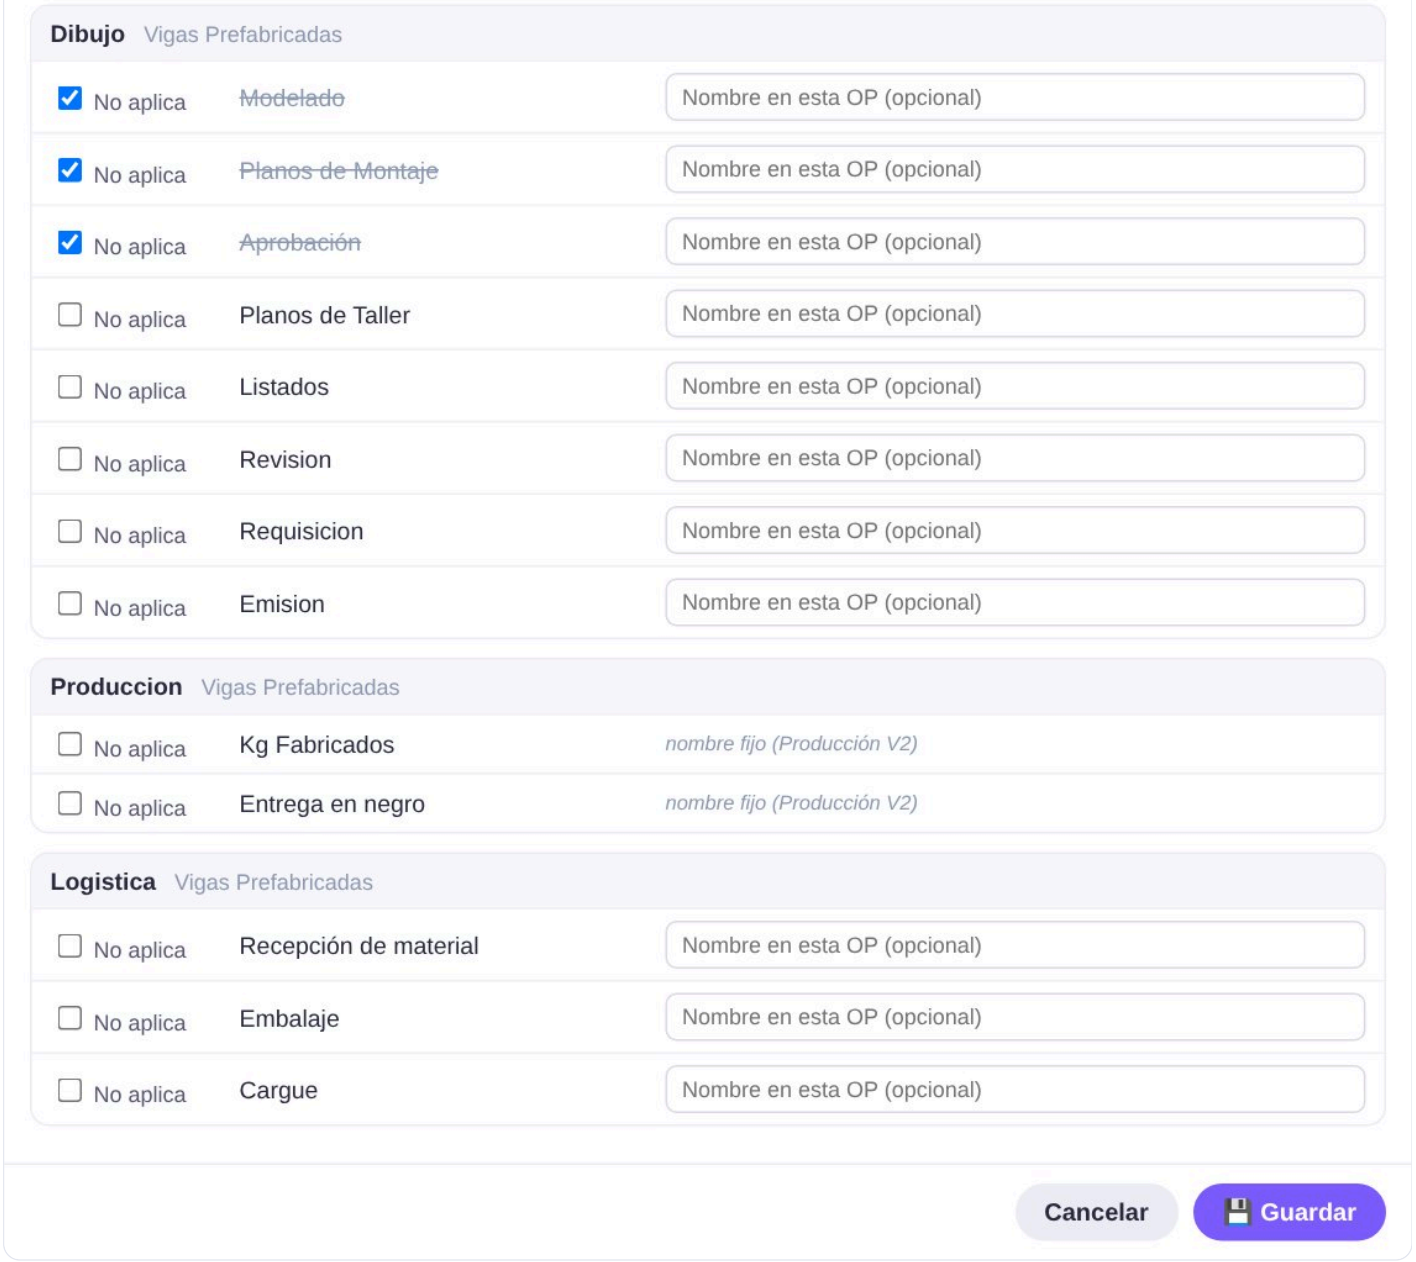


Figura 2. Cuadro 🧩 Ajustar tareas del cronograma: marque "No aplica" en las tareas que no se hacen y, si lo necesita, escriba un nombre propio para esta OP. En Producción, Kg Fabricados y Entrega en negro tienen nombre fijo.

5.7 Registrar la entrega real

1. Usar 🚚 Registrar entrega real al cliente (desde la hoja de la OP, o escribiendo el número).
2. Escribir la fecha real (dd/mm/aaaa); no puede ser futura.
3. Escribir una observación, por ejemplo número de remisión o quién recibió.
4. La macro muestra si la entrega fue a tiempo frente a la fecha original y la vigente.

La entrega real queda fija. Solo un usuario de AUTORIZADOS_ENTREGA puede corregirla, con motivo obligatorio.

6. Manual de usuario — Áreas y Producción V2

Cada área registra su avance en la hoja "Cronograma" de su archivo; solo diligencia cinco columnas, y el resto lo llenan Comercial o las fórmulas.

6.1 Columnas que diligencia el área

Columna	Campo	Cómo se llena
P	ESTADO	Abierto, En pausa, Reproceso o Terminado
S	KG_AVANCE_ACUMULADO	Kg acumulados de la tarea (áreas que miden por kg)
U	FECHA_INICIO_TAREA_REAL	Fecha en que empezó la tarea. Las tareas nuevas la traen vacía; las siguientes se encadenan solas cuando la anterior tiene fin real
V	DURACION_DIAS_TAREAS_REAL	Días hábiles que duró o va a durar la tarea
AC	OBSERVACIONES	Notas de la tarea; se ven en la App con 👁 Ver observaciones

La fecha fin real (W) se calcula sola con días hábiles y festivos de Colombia. Las columnas de plan (desde AE), la fecha de entrega (AD), los nombres de tarea y las de datos generales vienen de Comercial y no se modifican en el área.

6.2 Estados de una tarea

Estado	Cuándo usarlo	Efecto
Abierto	Estado inicial; tarea sin terminar	No suma avance por sí solo
En pausa	Tarea detenida	En áreas de pesos fijos suma un aporte parcial
Reproceso	Tarea que se está rehaciendo	Cuenta como evidencia de actividad
Terminado	Tarea completa	Suma su peso completo; su fecha fin real queda protegida
No aplica	La tarea no se hace en el contrato	Solo lo marca Comercial; no cuenta y su peso se reparte

6.3 Reglas de protección en los cronogramas

- En una tarea **Terminado** con fecha real válida no se puede cambiar el inicio real, la duración real ni el fin real, ni sacarla de Terminado.
- La **fecha de entrega al cliente** no se cambia desde el área.
- **"No aplica"** no se pone ni se quita desde el área.
- Si alguien lo intenta, el cambio se deshace al instante, queda como "Intento bloqueado" en el Historial y se incluye en el siguiente correo de cambios.
- Todo cambio de estado, fechas o kg queda en el Historial con usuario, fecha y valores.

Si una fecha protegida está mal (por ejemplo, un año mal digitado), la corrige un usuario autorizado (6.5, procedimiento PR-06).

6.4 Producción V2 (Bogotá y Barranquilla)

Producción tiene **un archivo por planta**: PLANTILLA_LOOKER_PRODUCCION_V2 (Barranquilla) y PLANTILLA_LOOKER_PRODUCCION_V2_BOGOTA (Bogotá). Cada planta trabaja solo en el suyo, con el mismo código y los mismos menús. Una OP MIXTO aparece en los dos, pero cada archivo solo programa y sincroniza las subestructuras de su planta; las de la otra planta quedan en gris.

Tareas de Producción en el cronograma. Cada subestructura tiene dos tareas, cada una con 50 % del peso del área:

Tarea	Qué mide	Se alimenta de
Kg Fabricados	Kg fabricados de la subestructura	Fila de la OP (kg reales del día) en la hoja del mes
Entrega en negro	Kg entregados en negro (sin galvanizar ni pintar)	Fila ENTREGA MATERIAL EN NEGRO en la hoja del mes

Las OP terminadas antes del cambio conservan sus 5 tareas antiguas (Corte, Armado, Soldadura, Calidad y Entrega en negro). En ellas el aporte de cada tarea depende de los kg registrados frente al peso de la subestructura: si faltan kg, Producción no llega al 100 % aunque todas las tareas digan Terminado.

Hojas del mes. Producción registra los kg de cada día en las hojas mensuales (por ejemplo "NOVIEMBRE 2026"). Cada subestructura es un bloque de cuatro filas:

Fila	Qué se digita
OP 4127_1 · Nombre	Kg fabricados en el día
PLANEADO	Kg que se planeaba fabricar ese día
DIFERENCIA	Se calcula sola
ENTREGA MATERIAL EN NEGRO	Kg entregados en negro ese día. No suma en el TOTAL REAL del día; tiene su propio TOTAL ENTREGA

PRODUCCION BOGOTA NOVIEMBRE 2026 (extracto)

PROYECTO	CLIENTE	DESCRIPCION	PESO KILOS PLANEADOS	REPORTE A LA FECHA	PENDIENTE	lun 02	mar 03	mié 04	jue 05	vie 06
OP 4109_1 · PEDIDO 05	**Consorcio Colectora Guajira**	**PEDIDO 05**	**14,679**	**7,821**	**6,858**	**0**	**1,961**	**2,681**	**1,501**	**1,378**
PLANEADO						0	2,000	2,000	2,000	2,800
DIFERENCIA						0	-39	681	-499	-1,422
ENTREGA MATERIAL EN NEGRO				**7,489**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OP 4106_1 · PEDIDO 61	**GEB**	**PEDIDO 061**	**6,172**	**1,654**	**4,518**	**0**	**509**	**382**	**0**	**254**
PLANEADO						0	610	610	610	610
DIFERENCIA						0	-101	-228	-610	-356
ENTREGA MATERIAL EN NEGRO				**767**		**0**	**0**	**0**	**767**	**0**

Figura 3. Hoja del mes en Producción Bogotá (extracto): cada subestructura con su fila de kg fabricados, PLANEADO, DIFERENCIA y ENTREGA MATERIAL EN NEGRO.

Opción del menú 🏗️ Torre de Control	Para qué sirve
📤 Enviar / Crear O.P (botón "Crear O.P - Producción")	Programa una OP o subestructura de esta planta en la hoja del mes
🔄 Sincronizar diario → Cronograma	Lleva los kg fabricados y los entregados en negro al cronograma
⏱ Activar sincronización automática (cada hora)	La misma sincronización cada hora; se activa una vez en cada archivo
🔁 Actualizar lista de OP del formulario	Refresca la lista desplegable de OP
🧹 Borrar de los meses las OP que no vienen de comercial	Limpia pruebas u OP no registradas
➕ Agregar fila ENTREGA MATERIAL EN NEGRO a las OP programadas	Agrega la fila nueva a los bloques que no la tienen (una sola vez)
🏭 Planta de este archivo...	Indica si el archivo es de BOGOTÁ o BARRANQUILLA (una sola vez)
✂️ Separar por planta (una vez)	Deja en el archivo solo las OP de su planta y las MIXTO; guarda copia en hojas "RESPALDO_SEP · ..."

Reglas de la sincronización:

- Solo **sube** valores: nunca baja los kg, nunca saca una tarea de Terminado y no borra datos digitados.
- "Kg Fabricados" toma los kg fabricados de la subestructura y "Entrega en negro" los kg entregados en negro. Cada una pasa a Terminado cuando sus kg alcanzan el peso de la subestructura.

- Toma la fecha de inicio más temprana entre la digitada y la del primer reporte diario.
- No toca una tarea Terminado con fecha real válida ni una tarea "No aplica".
- Cada archivo sincroniza solo las subestructuras de su planta.

6.5 Corrección de una fecha protegida

La hace un correo incluido en AUTORIZADOS_FECHAS, editando la celda en el cronograma del área. El cambio se conserva y queda en el Historial como "Cambio autorizado".

7. Manual de usuario — App web Torre de Control

La App es de consulta: muestra en un solo lugar lo que registran Comercial, las áreas y Producción. Los datos no se editan aquí, salvo las Tareas de la O.P.

7.1 Ingreso

1. Abra la dirección de la Torre de Control en el navegador.
2. Inicie sesión con su cuenta Google @polyuprotec.com. No se aceptan cuentas de otro dominio.
3. La App carga los datos de la Maestra. Use el botón de actualizar para traer los últimos cambios.
4. El manual de usuario se abre desde el menú lateral, en 📘 **Manual de usuario** (al final del menú). Se abre en una pestaña nueva, con la misma sesión.

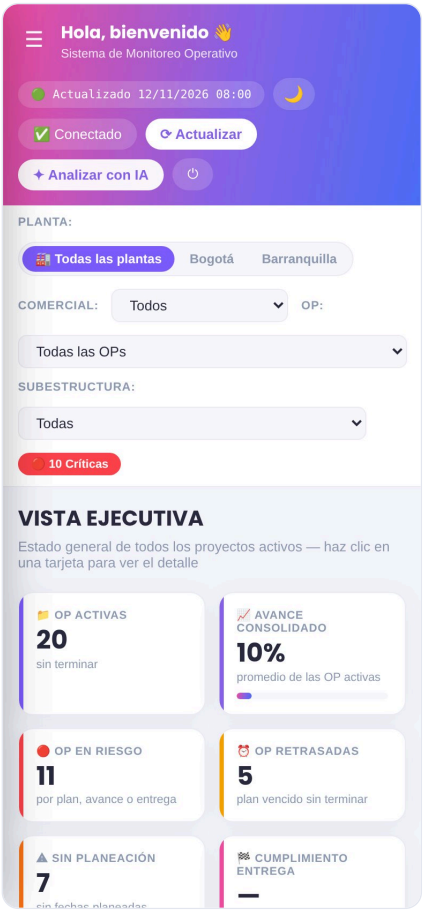


Figura 4. La App en un celular: el menú se abre con ☰ y los filtros quedan arriba.

7.2 Banda de resumen

En la parte superior aparecen 6 indicadores generales. Al hacer clic se abre el detalle de las OP que los componen. "Cumplimiento entrega" lleva a la vista Entregas.

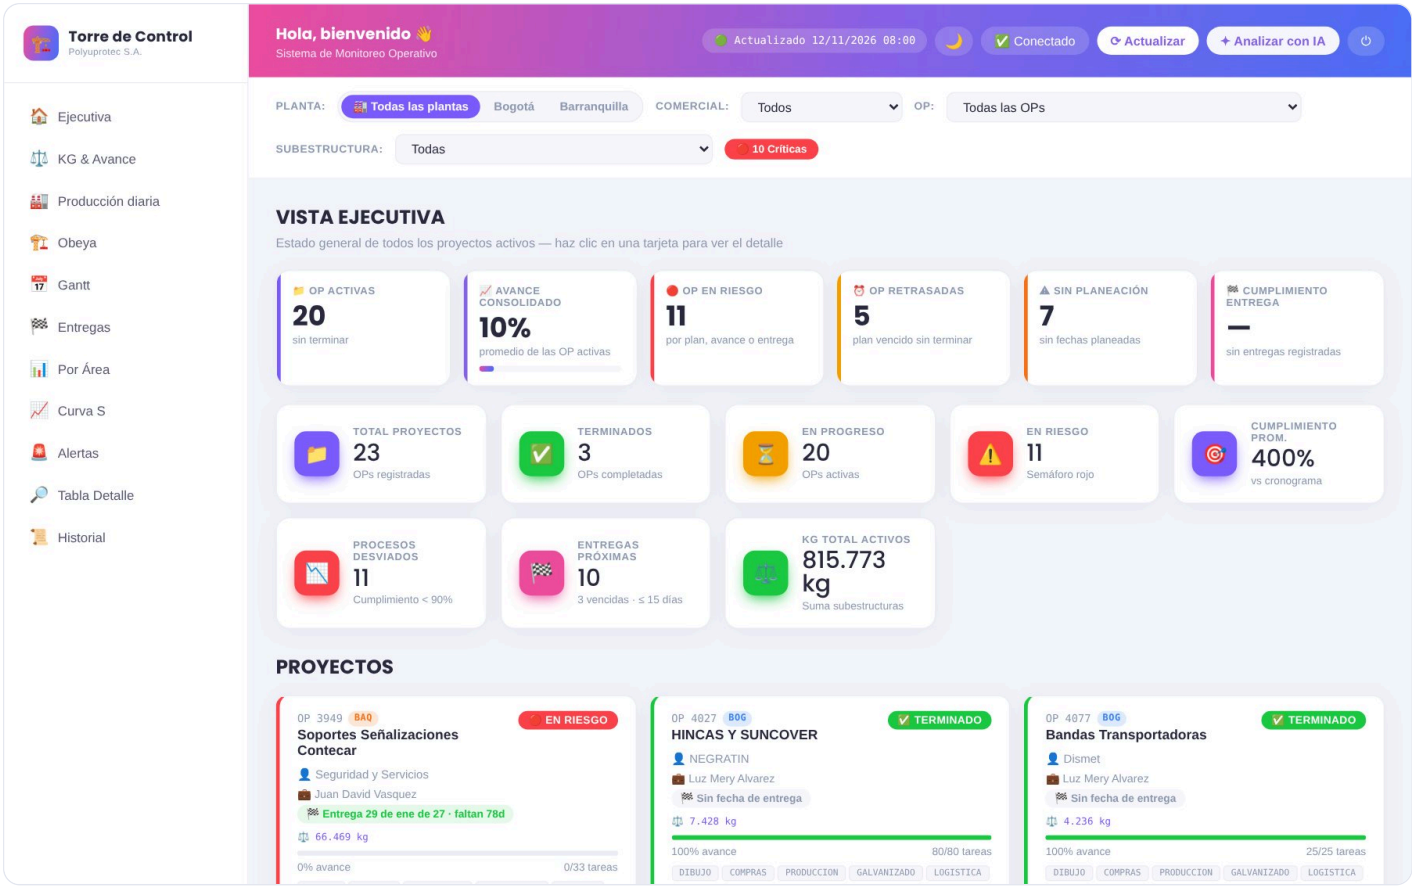


Figura 5. Vista Ejecutiva: filtro Planta arriba, banda de resumen y tarjetas de OP con su insignia de planta.

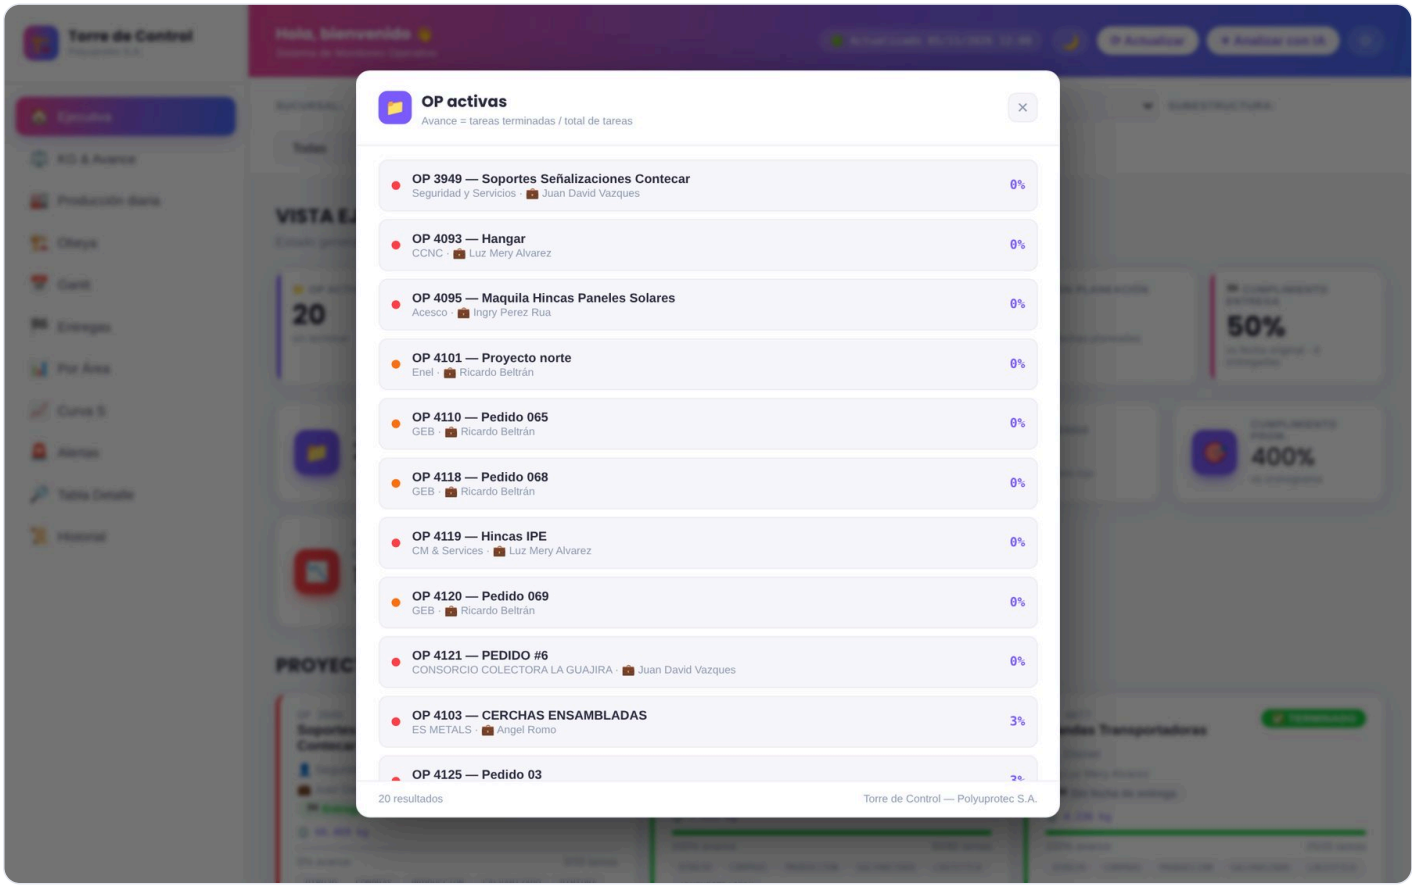


Figura 6. Al hacer clic en un indicador se abre la lista de OP que lo componen.

7.3 Vistas

Las vistas se eligen en el menú lateral. Todas respetan los filtros de la parte superior.

Vista (menú)	Qué muestra	Uso típico
🏠 Ejecutiva	Banda de resumen y una tarjeta por OP con semáforo, avance, áreas en orden de proceso, insignia de planta (BOG, BAQ o MIXTO) y botón 📝 Tareas de la O.P.	Revisión diaria
⚖️ KG & Avance	Kg ejecutados y avance por proceso y subestructura	Seguimiento de producción por peso
🏭 Producción diaria	Kg reportados por día desde los dos archivos de Producción V2, con su planta	Producción
🏗️ Obeya	Tablero por área con el avance de cada OP	Reunión de seguimiento
📅 Gantt	Plan vs. real por OP con 4 fechas (dd/mm/aaaa), paginador 10/20/50/Todos y avisos ⚠	Revisión de cronograma
🏁 Entregas	Indicador de cumplimiento de entrega, gráfica y reprogramaciones	Gerencia y Comercial
📊 Por Área	Avance y estados de tareas agrupados por área	Jefes de área
📈 Curva S	Avance planificado vs. real acumulado por semana	Gerencia
🚨 Alertas	Entregas en riesgo, OP vencidas, sin planeación, entregas inconsistentes y compromisos vencidos o bloqueos de las Tareas de la O.P.	Priorizar
🔎 Tabla Detalle	Todas las tareas con columna 👁 Ver observaciones	Consultar notas de las áreas
📜 Historial	Cambios y bloqueos registrados, con filtros	Auditoría

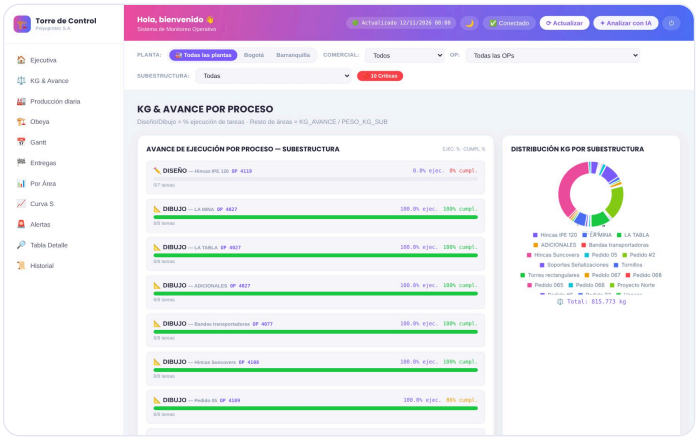


Figura 7. KG & Avance.

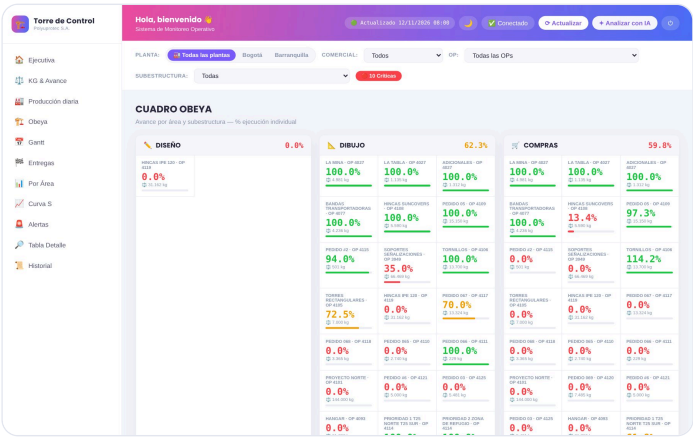


Figura 8. Obeya: avance de cada OP por área.

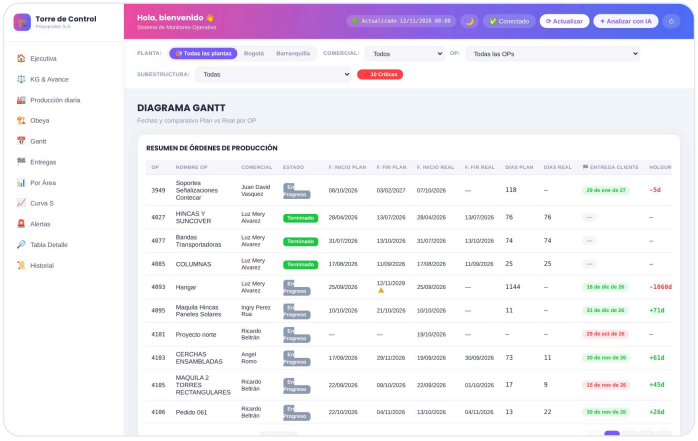


Figura 9. Gantt con las 4 fechas y el paginador.

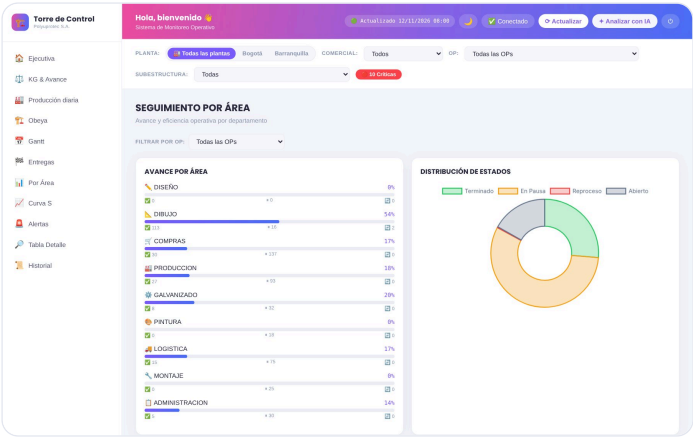


Figura 10. Por Área.

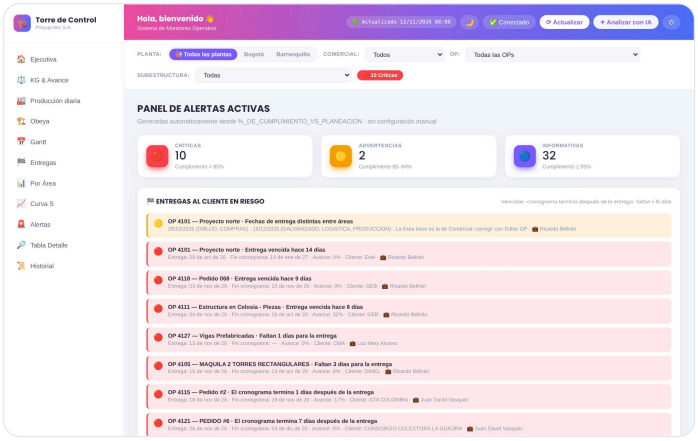


Figura 11. Alertas.

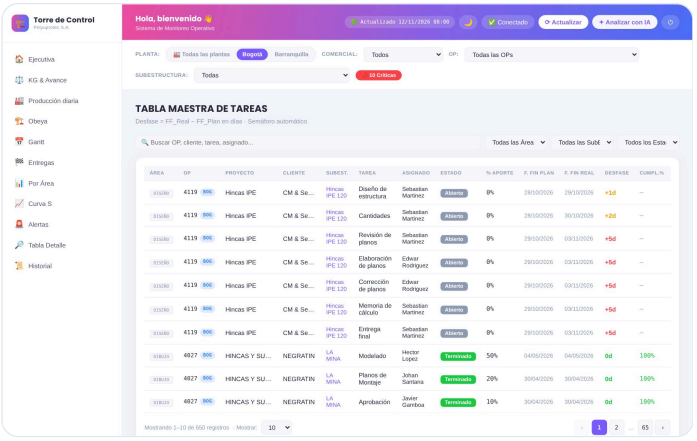


Figura 12. Tabla Detalle con la columna 👁.

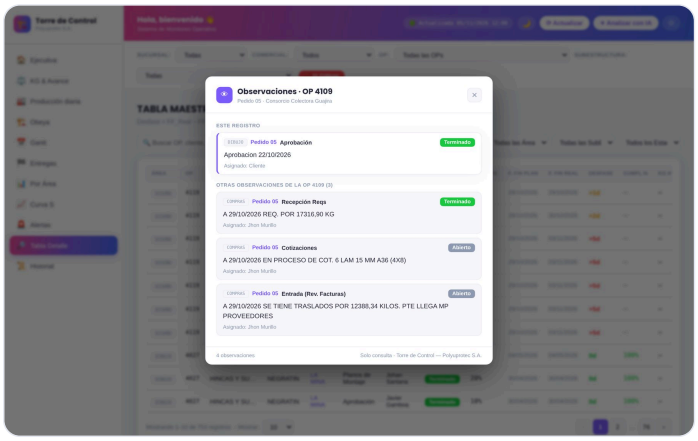


Figura 13. Ventana 👁 Ver observaciones: la nota de la tarea y las demás observaciones de la misma OP.

7.4 Semáforo y avisos

- Pase el puntero sobre el semáforo para ver **por qué** tiene ese color (regla, brecha, fechas).
- **Sin planeación** (naranja) significa que la OP no tiene fechas de plan.
- El ⚠ del Gantt indica una fecha a más de 2 años del plan o un fin real anterior al inicio; pase el puntero para ver el detalle.

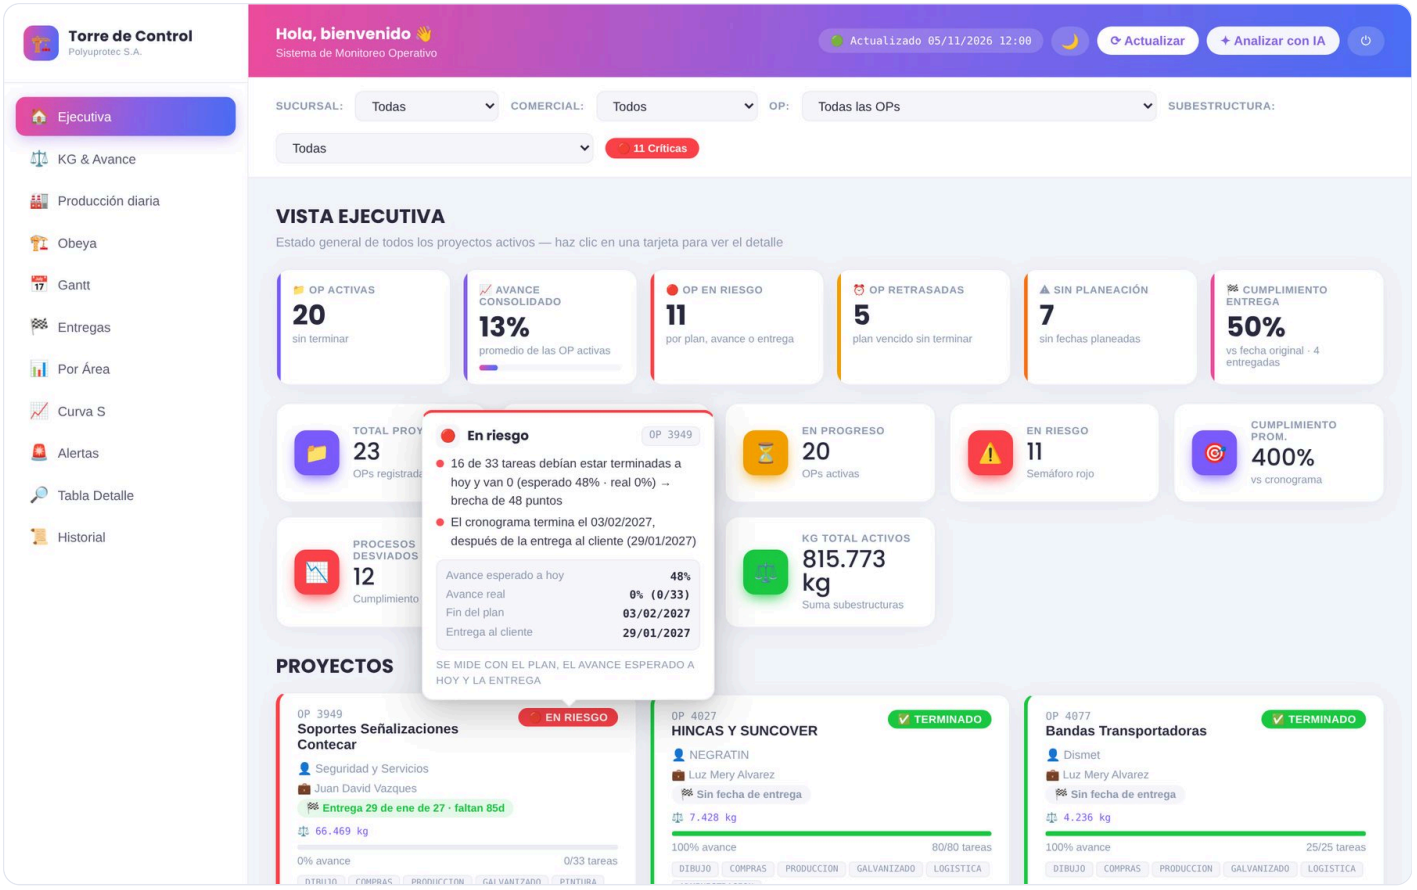


Figura 14. Al pasar el puntero sobre el semáforo aparece el motivo del color y los datos usados.

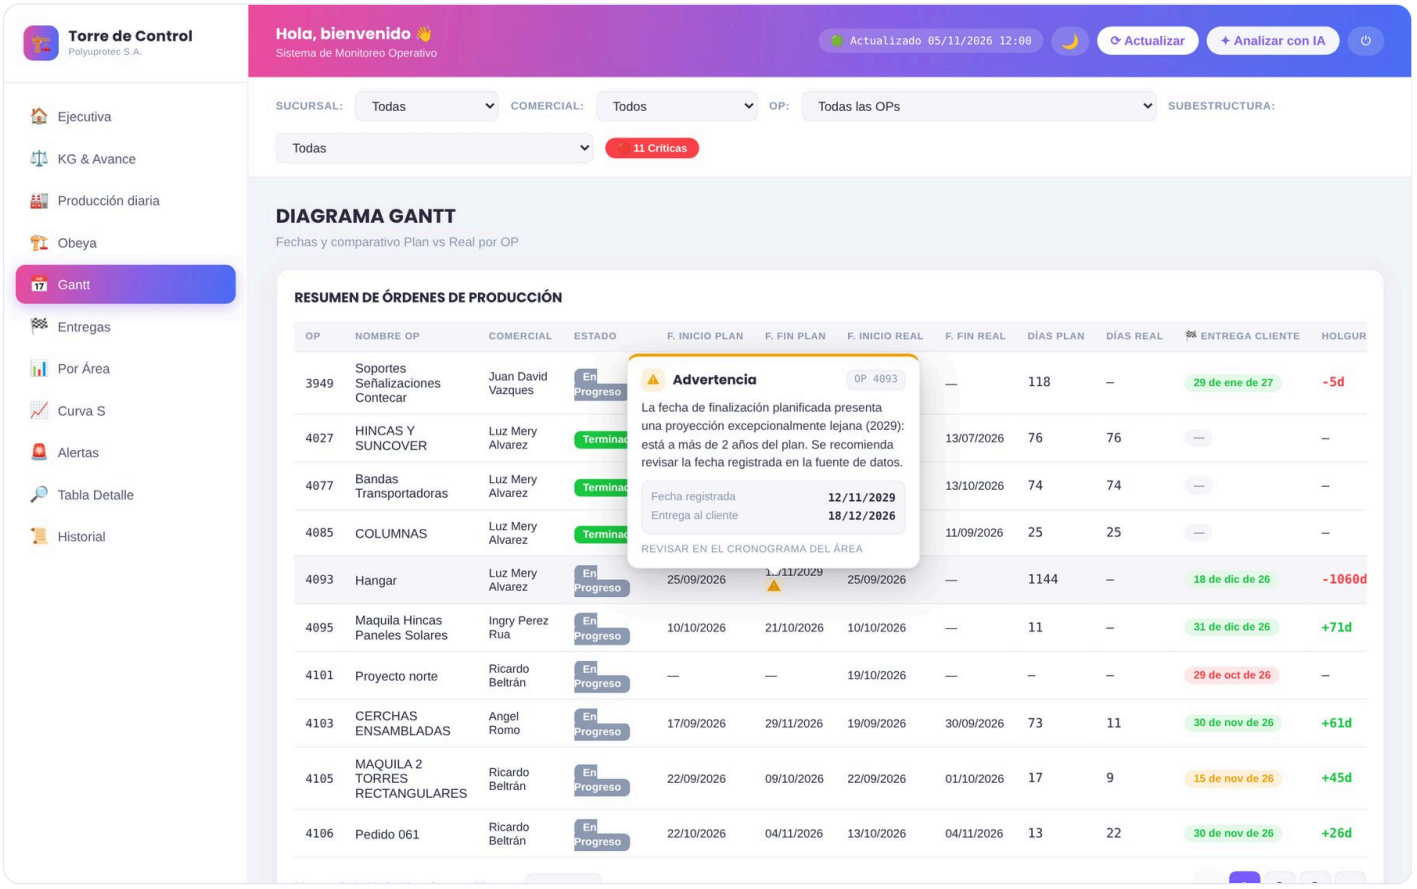


Figura 15. Aviso ⚠ del Gantt con el detalle de la fecha fuera de rango.

7.5 Filtros

Arriba de todas las vistas están los filtros **Planta**, Comercial, OP y Subestructura.

Planta tiene tres botones: Todas las plantas, Bogotá y Barranquilla. Al elegir una planta, todas las vistas (tarjetas, Gantt, Tabla Detalle, Producción diaria, Historial, Entregas, indicadores) muestran solo lo de esa planta:

- Las OP de esa sede y las MIXTO. En una OP MIXTO, las tareas de Producción que se ven son solo las de las subestructuras de esa planta; las demás áreas se ven completas.
- La App recuerda la planta elegida la próxima vez que se abra en ese navegador.
- Las insignias **BOG**, **BAQ** y **MIXTO** junto al número de OP indican la planta de cada OP.

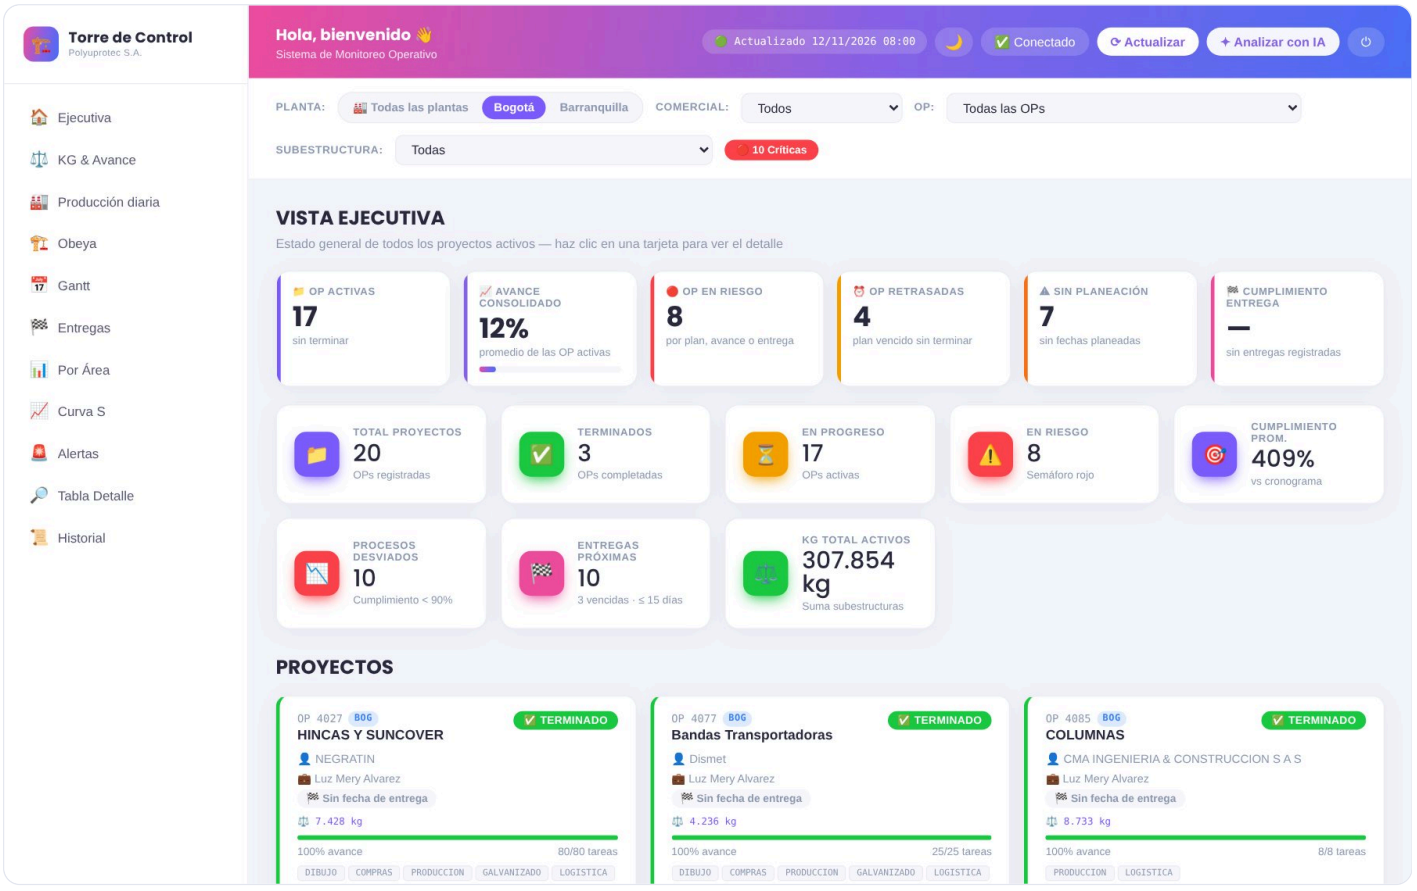


Figura 16. Con el filtro en Bogotá solo se ven las OP de Bogotá y las MIXTO; la App lo recuerda la próxima vez.

Las vistas también permiten filtrar por cliente, área y semáforo. El orden de las áreas siempre sigue el proceso: Diseño → Dibujo → Compras → Producción → Galvanizado → Pintura → Logística → Montaje → Administración → RRHH.

7.6 📝 Tareas de la O.P.

Aquí se suben los compromisos que se acuerdan para cada O.P. en las reuniones de seguimiento, además de notas y bloqueos. Antes se llamaba "Bitácora"; solo cambió el nombre. Cada registro lleva autor, fecha y hora.

1. En la tarjeta de la OP pulse 📝 **Tareas de la O.P.**. El botón muestra cuántos registros están abiertos y cuántos vencidos.
2. Elija el tipo (nota, compromiso o bloqueo), el área y escriba la descripción.
3. Para compromisos y bloqueos indique responsable y fecha compromiso.
4. Pulse **Guardar**.
5. Para cerrar un compromiso o bloqueo, pulse **Cerrar** y escriba una nota de cierre. Los registros no se borran.

Los compromisos vencidos y los bloqueos abiertos aparecen en Alertas y en el resumen semanal que llega por correo los lunes.

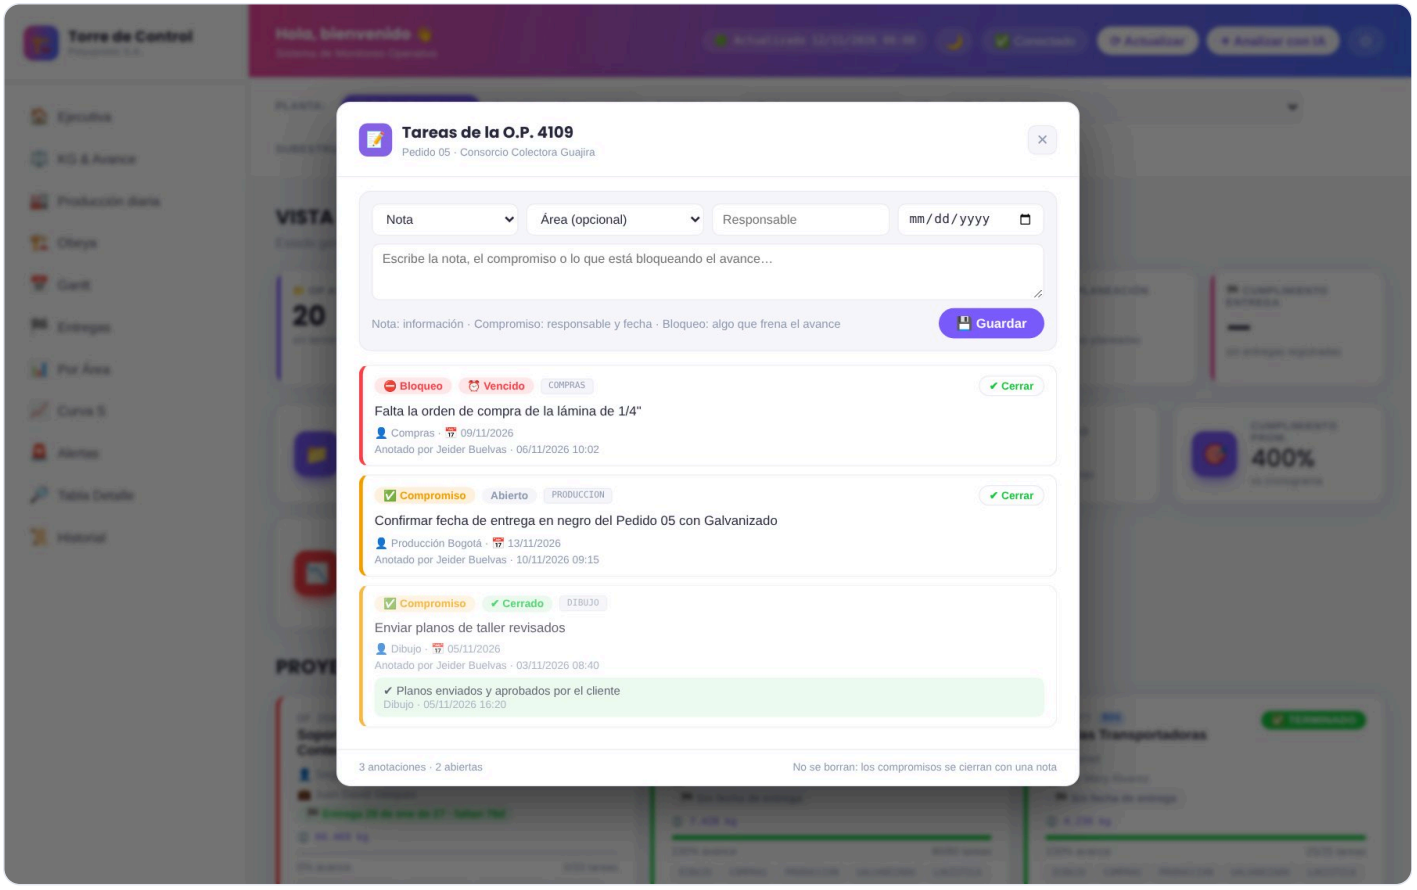


Figura 17. Ventana 📝 Tareas de la O.P.: formulario arriba; abajo los registros abiertos (los vencidos resaltados) y los cerrados con su nota de cierre.

7.7 Entregas

Muestra por OP la fecha original, la vigente y la real, los días de diferencia y si cumplió. El indicador oficial se mide contra la fecha **original** con tolerancia de 0 días. El botón de reprogramaciones muestra cada cambio con su motivo.

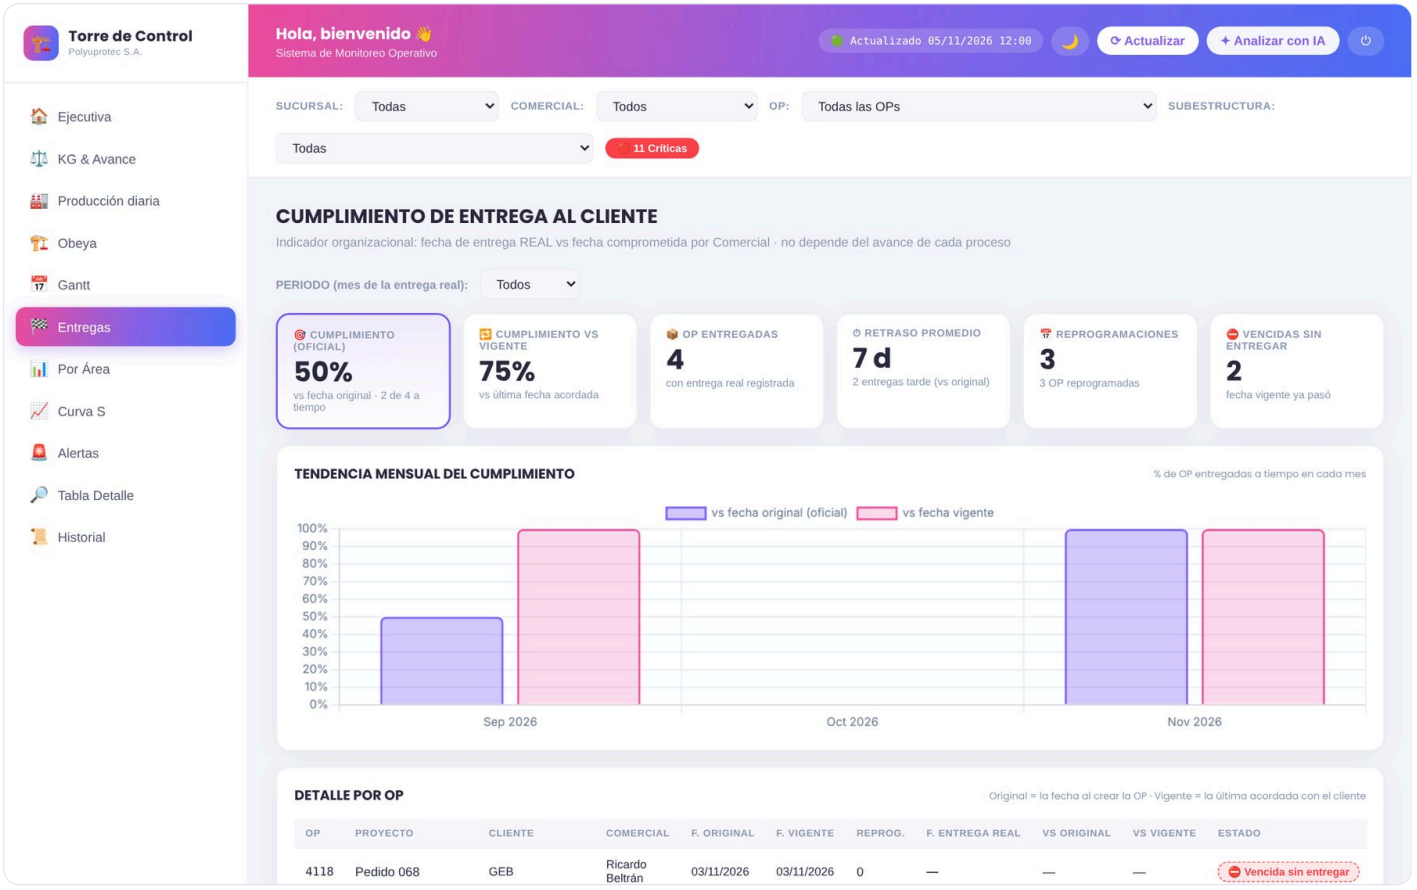


Figura 18. Vista Entregas: indicadores, tendencia mensual y detalle por OP.

7.8 Historial

Lista los cambios de estado, fechas y kg, los cambios autorizados, los intentos bloqueados y lo anotado en las Tareas de la O.P. Filtre por OP, área, tipo, usuario o fecha. Los cambios hechos en un archivo de Producción llevan su planta y respetan el filtro Planta. Los registros anteriores guardados como "Bitácora" se muestran como "Tareas de la O.P.", así que en el filtro de tipo hay un solo nombre.

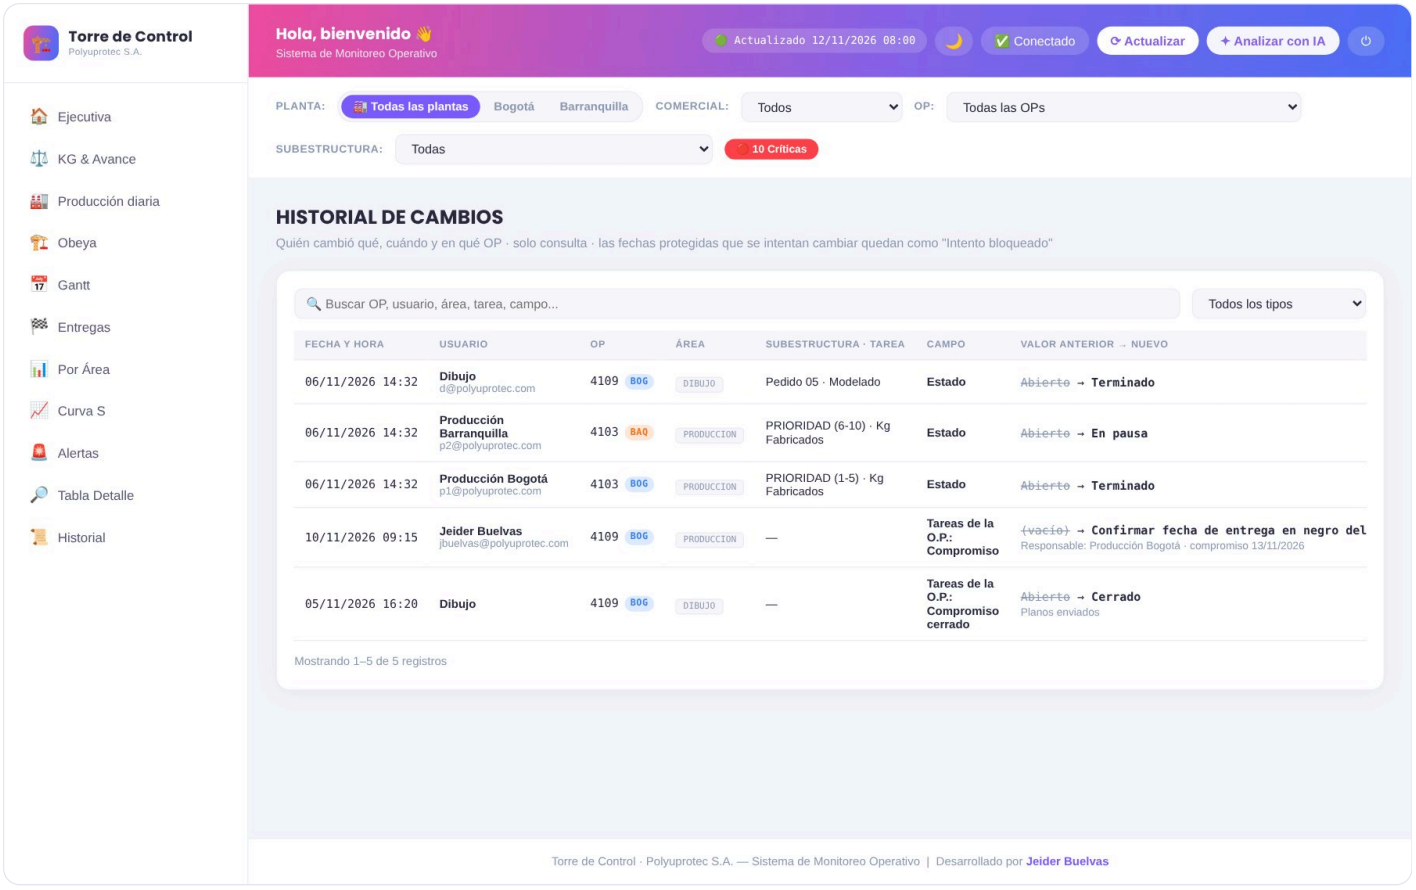


Figura 19. Vista Historial: cada cambio con su tipo, usuario, planta y valores anterior y nuevo. Lo anotado en Tareas de la O.P. también queda aquí.

7.9 🟢 Quién está en línea

En la barra superior, junto al correo del usuario, el botón 🟢 **N en línea** muestra cuántas personas tienen la Torre de Control abierta en ese momento. Al pulsarlo se abre una ventana con dos partes:

Parte	Qué muestra
En línea ahora	Nombre, correo, estado, hace cuánto se conectó, la vista que está viendo (por ejemplo Gantt o "Tareas de la O.P. 4109") y la planta elegida en el filtro
Hoy entraron	Todas las personas que abrieron la Torre en el día, con la hora del primer ingreso y la última vez (o "en línea" si siguen conectadas)

Estado	Significado
🟢 Activo	Tiene la Torre abierta y a la vista
🟡 Ausente	La tiene abierta, pero en otra pestaña o minimizada
⚪ (solo en "Hoy entraron")	Entró hoy y ya no está conectada

- La información se actualiza cada 30 segundos y enseguida cuando alguien cambia de vista o de planta.
- Al cerrar la Torre la persona sale de la lista; si se cierra de golpe (por ejemplo, se apaga el equipo), sale en máximo 90 segundos.
- "Hoy entraron" se reinicia cada día a medianoche (hora de Colombia).
- Todos los usuarios con sesión ven esta lista. El nombre y el correo salen del inicio de sesión de Google, así que nadie puede aparecer con otro nombre.

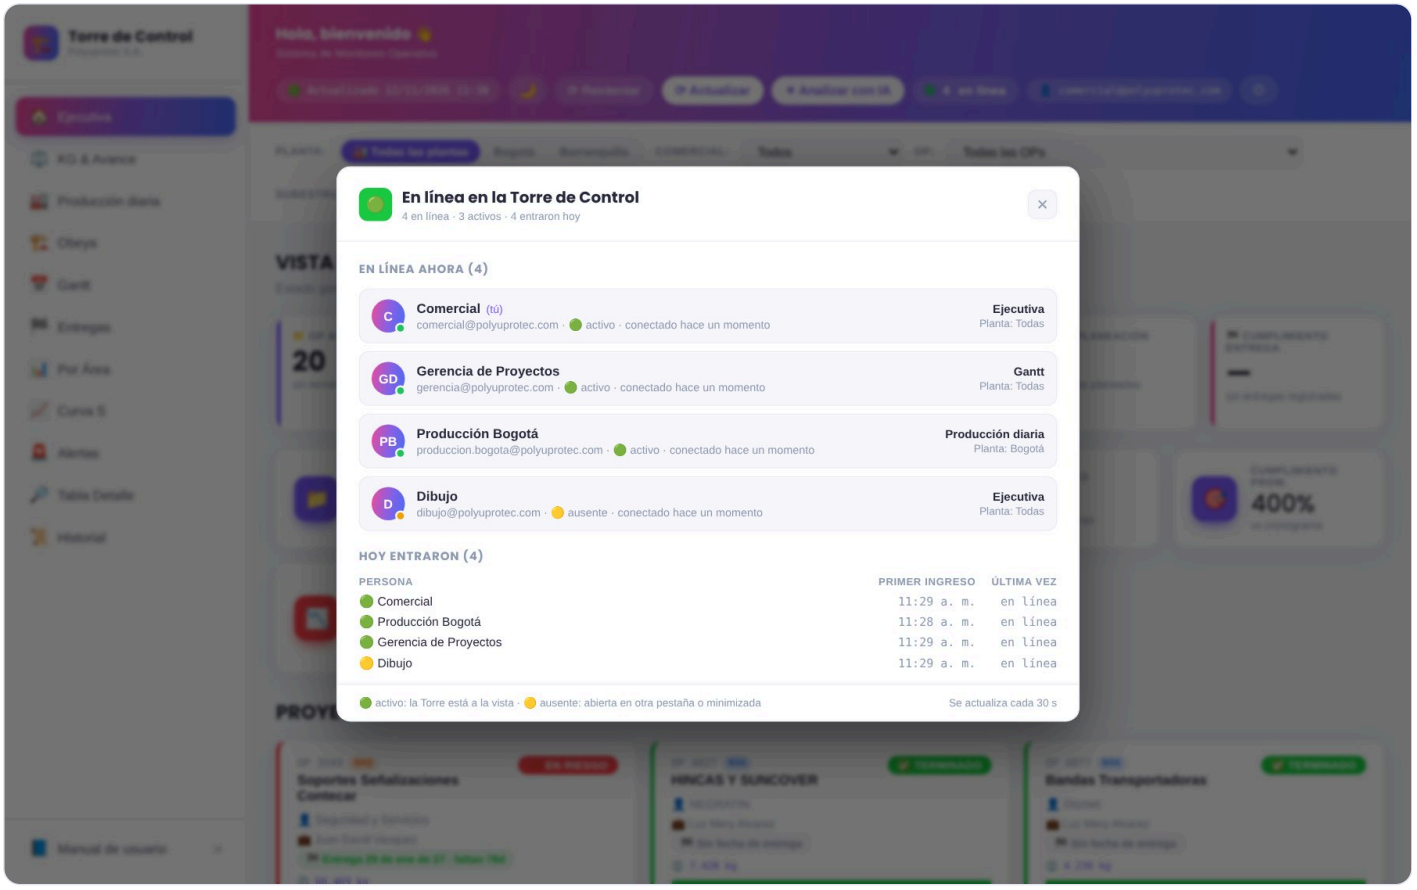


Figura 20. Ventana 🟢 En línea: quién tiene la Torre abierta, en qué vista y planta, y quién entró hoy.

8. Indicadores y reglas de cálculo

Todos los indicadores se calculan en la Maestra a partir de los cronogramas. La App solo los muestra, así que la misma regla aplica en todas las vistas.

8.1 Avance de la OP

- Cada tarea tiene un peso (columna Q, aporte). El avance del área es la suma de los aportes de sus tareas según su estado o kg.
- Las tareas **No aplica** aportan 0 y su peso se reparte proporcionalmente entre las demás tareas del área, así que el área puede llegar al 100 %.
- En Producción, "Kg Fabricados" y "Entrega en negro" pesan 50 % cada una.
- Los días de las tareas No aplica no suman en el total de días de la subestructura (planeado ni real).
- El avance real de la OP para el semáforo es el % de tareas Terminado.

8.2 Semáforo (regla v4.2)

Brecha = avance esperado − avance real. El avance esperado es el % de tareas cuyo fin planeado ya pasó.

Color	Se asigna cuando
🔴 Rojo	La entrega está vencida y la OP no está terminada; o el cronograma termina después de la entrega; o el plan venció hace más de 7 días; o la brecha es de 25 puntos o más
🟡 Amarillo	La brecha es de 10 puntos o más; o el plan venció hace 1 a 7 días; o la entrega es en 15 días o menos y el avance es menor al 80 %
🟢 Al día	No se cumple ninguna de las anteriores
🟠 Sin planeación	La OP no tiene fechas planeadas

Las reglas se evalúan en ese orden; la primera que se cumple define el color y se muestra como motivo.

8.3 Cumplimiento y eficiencia

- **Cumplimiento %** solo se calcula si hay evidencia de avance: al menos una tarea Terminado o Reproceso, o kg mayores a 0. Sin evidencia la OP aparece como "sin avance" y no como 0 % ni 100 %.
- **Cumpl. %** por tarea solo se muestra en tareas Terminado.
- **Eficiencia** compara duración real contra planeada en tareas Terminado; sin tareas terminadas queda vacía.
- La **fecha fin real** de la OP sale solo de tareas Terminado.

8.4 Cumplimiento de entrega al cliente

Fecha	Significado
Original	Primera fecha de entrega registrada. No se sobrescribe
Vigente	Fecha actual tras reprogramaciones; cada cambio exige motivo
Real	Fecha en que se entregó; la registra Comercial

Una OP **cumple** si la fecha real es igual o anterior a la original (tolerancia 0 días). El indicador es el % de OP entregadas que cumplen, y se muestra también el cumplimiento contra la fecha vigente como referencia.

8.5 Fechas inválidas

- Una fecha anterior al año 2000 se trata como vacía.
- En el Gantt se ignora un fin real anterior al inicio real, y se marca ⚠ una fecha a más de 2 años (730 días) del plan.

9. Control de datos, protección, trazabilidad y notificaciones

El sistema protege las fechas que sustentan los indicadores y deja rastro de cada cambio, para que los datos de la Torre de Control sean auditables.

9.1 Qué se protege

Dato	Regla	Quién puede cambiarlo
Fecha fin real e inicio/duración real de una tarea Terminado	No se modifica ni se saca de Terminado	Usuarios en AUTORIZADOS_FECHAS
Fecha de entrega comercial (línea base)	Se guarda en LINEA_BASE; un cambio en el área se revierte	Solo Comercial, con motivo
Estado No aplica	No se pone ni se quita en el área	Solo Comercial (🧩 Ajustar tareas del cronograma)
Fecha original de entrega	Nunca se sobrescribe	Nadie
Entrega real registrada	Bloquea nuevas reprogramaciones	Usuarios en AUTORIZADOS_ENTREGA

9.2 Hojas de trazabilidad

Hoja	Archivo	Contenido
HISTORIAL	Maestra	Cambios, cambios autorizados e intentos bloqueados: fecha, usuario, OP, área, tarea, campo, valor anterior y nuevo, y planta
LINEA_BASE	Maestra	Copia de las fechas protegidas para poder revertir
BITACORA_OP	Maestra	Tareas de la O.P.: notas, compromisos y bloqueos con su cierre
ENTREGAS_CLIENTE	Comercial	Una fila por OP con fecha original, vigente y real
REPROGRAMACIONES_ENTREGA	Comercial	Cada reprogramación con motivo, usuario y fecha

Estas hojas pueden ocultarse sin afectar el funcionamiento, pero no deben renombrarse, borrarse ni editarse a mano.

9.3 Notificaciones por correo

Correo	Cuándo	Destino
Nueva O.P	Al registrar una OP en Comercial ("¡Se registró una nueva O.P!")	todos@polyuprotec.com
Resumen de cambios	Cada 15 minutos, solo si hubo cambios o bloqueos	Desarrollo y las Obeya de Bogotá y Barranquilla (lista en notificar_cambios.php)
📝 Tareas de la O.P. (semanal)	Lunes a las 7:00: compromisos vencidos, los que vencen en 7 días y bloqueos abiertos	todos@polyuprotec.com

Los correos salen de la cuenta de notificaciones del servidor de la Torre de Control. Las credenciales están solo en el servidor y no se incluyen en este documento.

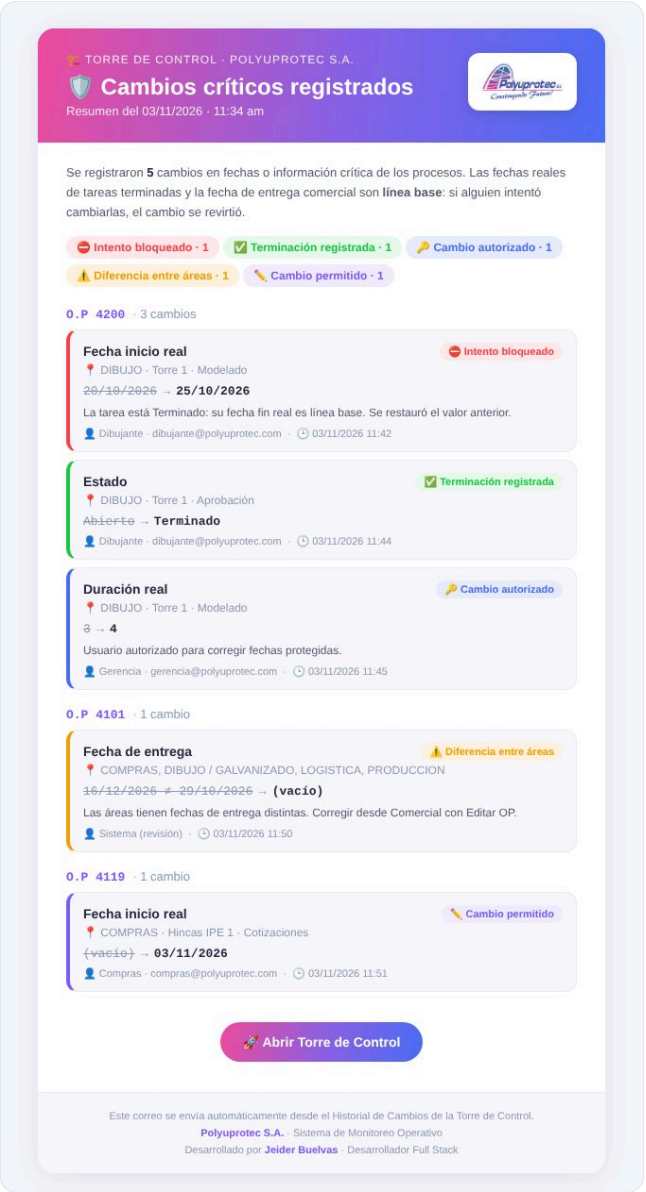


Figura 21. Correo "Cambios críticos registrados".

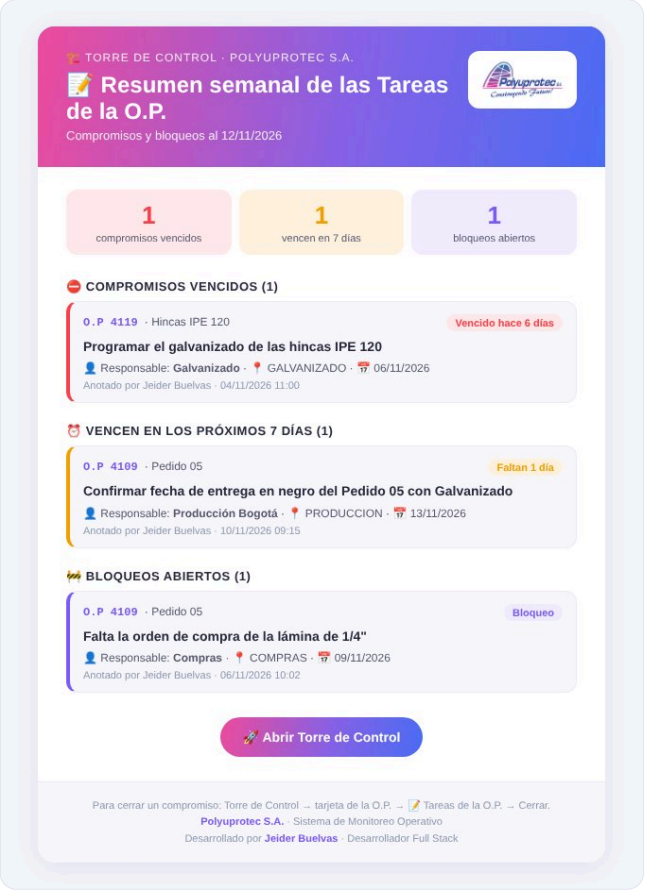


Figura 22. Correo semanal 📝 Tareas de la O.P.: compromisos vencidos, los que vencen en 7 días y bloqueos abiertos.

9.4 Seguridad de acceso

- La App y las Tareas de la O.P. exigen sesión Google del dominio polyuprotec.com.
- El autor de cada registro de las Tareas de la O.P. se toma de la sesión, no de lo que escriba el usuario.
- La comunicación entre el servidor y Apps Script usa un token privado que solo conoce el administrador.
- El indicador 🟢 en línea solo funciona con sesión @polyuprotec.com. Guarda el último aviso de cada persona y los ingresos del día en la carpeta datos_presencia del servidor, bloqueada al navegador; no guarda datos de las OP.

10. Administración, instalación, despliegue y mantenimiento

Esta sección es para el administrador del sistema (Desarrollo Full Stack). Cubre las versiones vigentes, cómo publicar cambios y las tareas de mantenimiento.

10.1 Versiones vigentes (Torre de Control v3.2)

Componente	Archivo	Versión
Macro Comercial	MACRO_COMERCIAL	v14.10
Maestra (API, semáforo, protección, historial, Tareas de la O.P.)	MAESTRA_POLYUPROTEC	v4.7
Producción V2 (mismo código en Bogotá y Barranquilla)	PRODUCCION_V2	v4.5
App web	app.html + PHP (bitacora.php, notificar_cambios.php, notificar_bitacora.php, notificar_op.php, presencia.php)	12/11/2026

10.2 Publicar un cambio en Apps Script

1. Haga una copia de respaldo del código actual.
2. Pegue la nueva versión en el editor de Apps Script y guarde.
3. Si el archivo es la Maestra (Web App): **Implementar → Administrar implementaciones → Editar → Versión: Nueva versión → Implementar**. No cree una implementación nueva, porque cambia la URL y la App deja de recibir datos.
4. Recargue la hoja para que aparezca el menú actualizado.
5. Verifique en la App que los datos y el semáforo cargan.

10.3 Activadores

Activador	Archivo	Cómo se instala
Protección de cronogramas (onEdit en cada área)	Maestra	Menú → Instalar protección
Resumen de cambios (cada 15 min)	Maestra	Se instala con la protección
Correo semanal de Tareas de la O.P. (lunes 7:00)	Maestra	Menú → 📅 Activar correo semanal de Tareas de la O.P.
Sincronización diaria (cada hora)	Producción V2, en cada archivo (Bogotá y Barranquilla)	Menú → ⏱ Activar sincronización automática

Para revisar o eliminar activadores use el panel "Activadores" del proyecto de Apps Script. Instale cada activador una sola vez para evitar correos duplicados.

10.4 Servidor web

- Suba app.html y los archivos PHP a la carpeta de la Torre de Control en el hosting.
- La carpeta datos_presencia (indicador 🟢 en línea) debe existir con su archivo .htaccess de bloqueo; no se borra ni se sube desde GitHub.
- Configure en cada PHP la URL de la Web App, el token y los datos SMTP. Estos valores no se documentan aquí; los custodia el administrador.
- Pruebe con las opciones del menú "✉️ Probar correo de cambios" y "✉️ Probar correo de Tareas de la O.P.".

10.5 Parámetros configurables

Parámetro	Dónde	Valor actual
AUTORIZADOS_FECHAS	Maestra	Vacío (debe diligenciarse)
AUTORIZADOS_ENTREGA	Comercial	Vacío (debe diligenciarse)
ORDEN_AREAS	Comercial y App	Diseño → ... → RRHH
MOTIVOS_REPROG	Comercial	Lista de motivos de reprogramación
TOLERANCIA_ENTREGA_DIAS	App	0
GANTT_DIAS_AVISO	App	730
ID_COMERCIAL / ID_MAESTRA	Maestra	IDs de los archivos de Google Sheets
IDS_PRODUCCION_PLANTA	Comercial	ID del archivo de Producción de cada planta (Bogotá y Barranquilla)

10.6 Mantenimiento periódico

- **Semanal:** revisar en Historial los intentos bloqueados y en Alertas las OP sin planeación o con entregas inconsistentes.
- **Mensual:** crear la hoja del nuevo mes en los dos archivos de Producción V2 y revisar que la sincronización corre en ambos.
- **Trimestral:** revisar el tamaño de HISTORIAL y BITACORA_OP (Tareas de la O.P.) y archivar si pasa de varios miles de filas; revisar la lista de autorizados.
- **Ante cada cambio:** aplicar la regla "original funcional + solo modificaciones = final" y comparar original vs. final antes de publicar.

11. Solución de problemas frecuentes

La mayoría de las fallas vistas en la operación vienen de datos digitados o de no publicar la nueva versión de la Web App, no del código.

Síntoma	Causa probable	Solución
Un cambio en el código no se ve en la App (p. ej. no sale el motivo del semáforo)	No se publicó una nueva versión de la Web App	Implementar → Administrar implementaciones → Editar → Nueva versión (10.2)
Error "ID ilegal" o la vista Entregas sale vacía	ID_COMERCIAL mal escrito (por ejemplo l minúscula en vez de I mayúscula)	Copiar el ID desde la URL del archivo, sin digitarlo
Una OP no muestra fecha de entrega	La OP no tiene fecha en Comercial ni en las áreas	Registrar la fecha en Comercial
Alerta "entregas distintas"	Las áreas tienen fechas de entrega diferentes para la misma OP	Comercial corrige y envía la OP a las áreas
⚠ en el Gantt con año lejano (p. ej. 2029)	Año mal digitado en una fecha	Corregir la fecha (si está protegida, por un autorizado)
Duración de miles de días	Fecha de inicio con año 1900	Ya se trata como vacía (V2 v4.1); digitar la fecha correcta
El semáforo está en "Al día" sin avance	Versión antigua de la Maestra	Verificar que está en v4.2 o superior
"Sin planeación"	La OP no tiene fechas de plan	Comercial programa el cronograma
Filas duplicadas en ENTREGAS_CLIENTE	Ejecución simultánea en versiones anteriores a v14.1	Usar v14.1 o superior; la Maestra ya ignora duplicados
Mi cambio se deshizo solo	Se intentó modificar un dato protegido	Ver el registro en Historial y pedir la corrección a un autorizado
Buscar O.P tarda al abrir una OP	Primera carga de la lista	Esperar la barra "Abriendo O.P..."; no cerrar el cuadro antes de que termine
No llegan correos	Activador no instalado o datos SMTP del servidor	Revisar activadores y probar con "Probar correo"
Las Tareas de la O.P. no guardan	Sesión vencida o cuenta fuera del dominio	Volver a iniciar sesión con la cuenta @polyuprotec.com
Un área no llega al 100 %	Tareas que no se hacen siguen activas	Comercial las marca No aplica en 🧩 Ajustar tareas del cronograma
Una OP antigua de Producción (5 tareas) no cierra aunque todo esté Terminado	Faltan kg registrados: el aporte depende de los kg frente al peso de la subestructura	Registrar los kg que faltan; si se fabricaron todos, KG_AVANCE_ACUMULADO debe igualar el peso de la subestructura
Al enviar una OP sale "No se pueden combinar celdas en una fila filtrada"	El área dejó un filtro activo en su Cronograma (versiones anteriores a v14.10)	Desde Comercial v14.10 el filtro se suelta y se restaura solo; con una versión anterior, quitar el filtro y volver a enviar
#DIV/0! o 01/01/1900 en el cronograma de un área	Fórmulas anteriores a v14.9 sin datos reales todavía	Comercial: menú 🩹 Corregir fórmulas
Editar OP corta la carga o sale un aviso de validación en C6	El comercial guardado ya no está en la lista desplegable	Desde v14.9 la OP se carga igual y se escoge el comercial en C6
No aparece el botón 🟢 en línea	La App se abrió sin sesión o es una versión guardada en caché	Iniciar sesión con la cuenta @polyuprotec.com y recargar con Ctrl + F5
Una OP no aparece al filtrar por planta	La sede de la OP no corresponde a esa planta	Revisar la sede en Comercial; las OP MIXTO aparecen en las dos plantas

11.1 Casos de datos pendientes a la fecha

- OP 4093: fecha de Montaje con año 2029.
- OP 4101: fechas de entrega inconsistentes entre áreas.
- OP 4027, 4077 y 4085: sin fecha de entrega. La 4085 ya quedó con Producción al 100 % (12/11/2026).
- OP 4127: Armado y Soldadura deben marcarse No aplica.
- Listas AUTORIZADOS_FECHAS y AUTORIZADOS_ENTREGA vacías.

12. Insumos para procedimientos internos

Estos son los procedimientos que propone el sistema tal como funciona hoy. Cada uno puede pasarse al formato oficial de calidad de la empresa.

PR-01 Registro de una nueva OP

- **Responsable:** Comercial. **Frecuencia:** cada contrato nuevo.
- **Pasos:** 1) Crear la OP en la base del creador con datos generales y subestructuras. 2) Registrar la fecha de entrega comprometida (queda como fecha original). 3) Ajustar tareas con 🧩 Ajustar tareas del cronograma (No aplica, nombres). 4) Enviar la OP a las áreas. 5) Programar en Producción V2, en el archivo de la planta que corresponda.
- **Registros:** hoja de la OP, ENTREGAS_CLIENTE, correo "Se registró una nueva O.P".

PR-02 Actualización de avance por área

- **Responsable:** jefe o encargado de cada área. **Frecuencia:** diaria o cada vez que cambie una tarea.
- **Pasos:** 1) Abrir el cronograma del área. 2) Actualizar estado, inicio real, duración y kg. 3) Marcar Terminado solo cuando la tarea esté completa. 4) Escribir observaciones si hay novedades.
- **Registros:** cronograma del área, HISTORIAL.

PR-03 Reporte diario de producción

- **Responsable:** Producción de cada planta (Bogotá y Barranquilla). **Frecuencia:** diaria.
- **Pasos:** 1) En el archivo de su planta, digitar en la hoja del mes los kg fabricados del día (fila de la OP) y los kg entregados en negro (fila ENTREGA MATERIAL EN NEGRO). 2) Verificar que la sincronización automática corrió o ejecutarla manualmente.
- **Registros:** PRODUCCION_V2 de cada planta, cronograma de Producción.

PR-04 Reprogramación de la fecha de entrega

- **Responsable:** Comercial, con visto bueno de la Gerencia. **Frecuencia:** cuando se requiera.
- **Pasos:** 1) Editar la OP y cambiar la fecha de entrega. 2) Elegir el motivo (obligatorio). 3) Guardar y enviar a las áreas. 4) Informar al cliente.
- **Registros:** REPROGRAMACIONES_ENTREGA. La fecha original no cambia y el indicador oficial sigue midiendo contra ella.

PR-05 Registro de la entrega real

- **Responsable:** Comercial. **Frecuencia:** cada entrega al cliente.
- **Pasos:** 1) Usar "Registrar entrega". 2) Digitar la fecha real con soporte (remisión o acta). 3) Verificar en la vista Entregas.
- **Registros:** ENTREGAS_CLIENTE.

PR-06 Corrección de fechas protegidas

- **Responsable:** usuario autorizado (AUTORIZADOS_FECHAS). **Frecuencia:** excepcional.
- **Pasos:** 1) Recibir la solicitud con justificación. 2) Corregir la celda en el cronograma. 3) Verificar en Historial que quedó como "Cambio autorizado".
- **Registros:** HISTORIAL, solicitud escrita.

PR-07 Gestión de las Tareas de la O.P.

- **Responsable:** cualquier usuario; cierra el responsable del compromiso o bloqueo. **Frecuencia:** continua.
- **Pasos:** 1) Registrar desde la App, en 📝 Tareas de la O.P., los compromisos acordados en cada reunión, las notas y los bloqueos. 2) Revisar el correo de los lunes. 3) Cerrar con nota cuando se cumpla.
- **Registros:** BITACORA_OP.

PR-08 Seguimiento semanal de la Torre de Control

- **Responsable:** Gerencia de proyectos y jefes de área. **Frecuencia:** semanal.
- **Pasos:** 1) Revisar banda de resumen y OP en rojo o amarillo con su motivo. 2) Revisar Alertas, Tareas de la O.P. y cumplimiento de entregas. 3) Definir compromisos y registrarlos en 📝 Tareas de la O.P.
- **Registros:** BITACORA_OP, acta de reunión.

PR-09 Control de cambios del sistema

- **Responsable:** Desarrollo Full Stack. **Frecuencia:** cada cambio.
- **Pasos:** 1) Recibir la solicitud. 2) Explicar el cambio antes de programarlo. 3) Partir del original funcional y aplicar solo las modificaciones. 4) Probar comparando original vs. final. 5) Publicar (10.2) y actualizar la tabla de versiones.
- **Registros:** archivos de versión, este documento.

13. Glosario y anexos

13.1 Glosario

Término	Definición
OP	Orden de producción; corresponde a un contrato o pedido
Subestructura	Parte de una OP con su propio peso en kg (p. ej. OP 4127_1)
Maestra	Archivo que reúne los cronogramas de todas las áreas y sirve los datos a la App
Cronograma	Hoja de cada área con las tareas, el plan y el avance real de cada OP
Línea base	Fechas comprometidas que se guardan para compararlas y protegerlas
Fecha original	Primera fecha de entrega registrada; base del indicador oficial
Fecha vigente	Fecha de entrega actual tras reprogramaciones
Brecha	Avance esperado menos avance real, en puntos porcentuales
Evidencia	Tarea Terminado o Reproceso, o kg mayores a 0
No aplica	Tarea que no se ejecuta en esa OP; su peso se reparte
Obeya	Tablero visual de seguimiento por área
Tareas de la O.P.	Registro de compromisos de reunión, notas y bloqueos por OP (antes "Bitácora")
Planta	Sede de Producción: Bogotá o Barranquilla. Cada una tiene su archivo de Producción V2
MIXTO	OP con subestructuras en las dos plantas
Kg Fabricados	Tarea de Producción que mide los kg fabricados (50 %)
Entrega en negro	Tarea de Producción que mide los kg entregados sin galvanizar ni pintar (50 %)
Web App	Servicio de Apps Script que entrega los datos de la Maestra a la App
Activador	Tarea automática de Apps Script (por edición o por tiempo)

13.2 Anexos que acompañan este documento

Anexo	Contenido
A	Código fuente: MACRO_COMERCIAL v14.10, MAESTRA_POLYUPROTEC v4.7, PRODUCCION_V2 v4.5
B	Paquete de la App web (app.html y archivos PHP)
C	Botones PNG de las macros
D	Acta de acuerdos de la reunión del 03/11
E	Lista de usuarios autorizados (a diligenciar)

El código y los paquetes se entregan aparte. No contienen ni deben contener contraseñas en documentos compartidos.

13.3 Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró
1.0	05/11/2026	Versión inicial para procedimientos y manual	Jeider Buelvas — Desarrollo Full Stack
1.1	12/11/2026	Torre de Control v3.2: Producción con Kg Fabricados y Entrega en negro, dos plantas, 📝 Tareas de la O.P., correcciones de Comercial v14.9 y v14.10	Jeider Buelvas — Desarrollo Full Stack
1.2	12/11/2026	Indicador 🟢 en línea (sección 7.9) y enlace 📘 Manual de usuario en el menú de la App	Jeider Buelvas — Desarrollo Full Stack
